

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS  
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

305

FECHA

1-VI-98

**DATOS DEL PROYECTO**

NOMBRE : Procedimiento para la Contratación de Obra Pública Mediante Licitación Pública.

OBJETIVO : Adjudicar los contratos de obra pública a través de licitaciones por convocatoria, procurando las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo de ejecución para el Organismo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de páginas 73.

**AREA (S)****RESPONSABLE (S)**

Subdirector Gral. de Administración y Finanzas Vo. Bo.

Ing. José Antonio Padilla Longoria

Nombre y firma del Responsable

Subdirector General Técnico Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Reguero Bustos

Nombre y firma del Responsable

Director de Programación y Presupuesto Vo. Bo.

M. en E. Mario J. Zepeda Martínez

Nombre y firma del Responsable

Director de Operación Vo. Bo.

Ing. Andrés Reynoso Gómez

Nombre y firma del Responsable

Gerente de Organización y Sistemas Vo. Bo.

José Julio Carabina Collins

Nombre y firma del Responsable

**AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL**

VIGENTE A PARTIR DE : 1 - VI - 98

ING. PEDRO LUIS BENITEZ ESPARZA

OBSERVACIONES: Este procedimiento sustituye a los de nombre Adjudicación de Contratos de Obra Pública y Formalización de Contratos, de folios 195 y 196, de fecha 1-VI-94.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

01

VI

98

DE 73

**CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA**



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

01

VI

98

DE 73

## OBJETIVO

Adjudicar los contratos de obra pública a través de licitaciones públicas por convocatoria, procurando las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo de ejecución para el organismo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

01

VI

98

DE 73

## POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la contratación de obra pública a través de licitación pública por convocatoria.
- Para los efectos del presente documento, se entenderá por:
  - **OBRA PUBLICA:**
    - I. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles.
    - II. Los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la dirección o supervisión de la ejecución de las obras, los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones cuando el costo de éstas sea superior al de los bienes muebles que deban adquirirse.
    - III. Los proyectos integrales, que comprenderán desde el diseño de la obra hasta su terminación total.
  - **ORGANISMO.-** El Sistema de Transporte Colectivo.
  - **UNIDAD DE OBRA PUBLICA.-** Las unidades administrativas facultadas para llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de las obras públicas y servicios relacionados con la misma que requiera el Organismo para la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de sus inmuebles e instalaciones.
  - **COMPRANET.-** El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de la Contraloría.
  - **MEDIO MAGNETICO.-** El dispositivo de almacenamiento de información conocido como disco flexible en formato de 3.5 pulgadas, compatible con computadoras personales.
  - **PROGRAMA DE CAPTURA.-** El programa informático desarrollado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo que el Organismo utilizará como medio de captura y entrega de información relativa.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

01 VI 98 DE 73

- **AREA BENEFICIARIA.-** Indistintamente, cualquier unidad orgánica con nivel de Gerencia cuyos requerimientos de trabajos de obra pública sean sujetos de ejecución a través de contratos celebrados con terceros.
  - **CONTRATISTA.-** La persona física o moral que celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma.
  - **ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA.-** Procedimiento utilizado para la contratación de obra pública a través del cual se hará del conocimiento por medio de convocatoria a todos aquellos contratistas interesados en participar que cumplan con los requisitos solicitados por la convocante, para la presentación de propuestas técnicas y económicas, las que se analizarán, compararán y seleccionarán procurando las mejores condiciones económicas, técnicas, administrativas y financieras para el Organismo.
  - **RESOLUCION.-** Documento en que se hace constar el análisis detallado de las proposiciones técnicas admitidas y se hace mención de las proposiciones técnicas desechadas, señalando las causas legales que motivaron el mismo.
  - **DICTAMEN.-** Documento en que se hace constar la evaluación de las propuestas económicas presentadas por los participantes en la licitación que servirá de base para la emisión del fallo de la licitación, mencionando los lugares correspondientes a las propuestas presentadas por los participantes que hayan satisfecho la totalidad de los requerimientos, indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones desechadas con las causas que originaron su exclusión.
  - **ACTO DE FALLO.-** Junta pública en la que se da a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubiesen participado en las etapas de presentación y apertura de proposiciones; en la misma se levantará el Acta de Fallo de la licitación.
  - **ACTA DE FALLO.-** Documento que contiene el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes en una licitación pública, para la adjudicación de contratos relativos a obra pública.
- La Dirección de Operación tendrá a su cargo la responsabilidad de dirigir, coordinar y controlar los procesos inherentes a la obra pública requerida por el Organismo, ya sea por administración directa o por obra contratada.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

01

VI

98

DE 73

- El titular de la misma podrá delegar esta responsabilidad en las unidades administrativas de la propia dirección que considere pertinente, que en lo sucesivo y para efectos del presente procedimiento, se denominarán como Unidades de Obra Pública.
- Al efecto, son Unidades de Obra Pública las siguientes:
  - En el caso de obras relativas a las instalaciones de la red del Sistema:
    - La Gerencia de Líneas 1, 3 y 4,
    - La Gerencia de Líneas 2, 5 y 6 y
    - La Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y “A”.
  - En el caso de obras relativas a las instalaciones a cargo de las áreas centrales:
    - El Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública y
    - El Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales.
- Para los efectos del presente procedimiento, los contratos de obra pública podrán ser de dos tipos:
  - **Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado**, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;
  - **A precio alzado**, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por actividades principales.

Los contratos de este tipo no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a ajuste de costos.

Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

01

VI

98

DE 73

- La Unidad de Obra Pública podrá convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública solamente cuando se cuente con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado, en la partida correspondiente, además de contar con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de construcción, el programa de ejecución y, en su caso, el programa de suministro.
- La obra pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al Organismo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
- Los montos máximos por los que la Unidad de Obra Pública podrá adjudicar contratos de obra pública mediante licitación pública se regirán por los rangos señalados en el Decreto por el que se establece el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del ejercicio que corresponda. Dichos montos serán actualizados anualmente, de acuerdo con el decreto mencionado.
- Los contratos que se adjudiquen de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento, deberán ser firmados en representación del Organismo, por los siguientes funcionarios:

| CON CARGO A PROYECTOS ASIGNADOS<br>AL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE<br>PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE<br>AREAS GENERALES                                                             | CON CARGO A PROYECTOS DE<br>GERENCIAS DE LINEA                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECTOR DE OPERACION Y JEFE DEL<br>DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE<br>PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE<br>AREAS GENERALES<br>SE REQUERIRA DE LA AUTORIZACION<br>DEL C. DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE<br>OPERACION, GERENTE DE LINEAS,<br>SUBGERENTE DE LINEAS Y JEFE DEL<br>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO<br>DE INSTALACIONES Y ADMINISTRACION<br>DE RECURSOS CORRESPONDIENTE. |

- Las licitaciones públicas podrán ser:
  - **Nacionales.**- Cuando únicamente puedan participar sociedades y personas de nacionalidad mexicana;
  - **Internacionales.**- Cuando puedan participar sociedades y personas de nacionalidad mexicana así como extranjeras.
- Solamente se realizarán licitaciones de carácter internacional cuando ello resulte obligatorio conforme a lo establecido en Tratados, cuando previa investigación de mercado que realice el Organismo, los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de la obra de que se trate, cuando sea conveniente en términos de precio, o bien, cuando ello sea



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

01

VI

98

DE

73

obligatorio en obra pública financiada con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval.

- Podrá negarse la participación de contratistas extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un Tratado o ese país no conceda un trato recíproco a los contratistas o a los servicios mexicanos.
- La Unidad de Obra Pública se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los Artículos 41 y 88 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
- Las convocatorias que podrán referirse a uno o más servicios u obras, se publicarán en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación y se deberán enviar, en Medio Magnético, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para su inclusión en COMPRANET.
- El Organismo deberá utilizar el Programa de Captura para el procesamiento y envío a COMPRANET de la siguiente información:
  - De las convocatorias de las licitaciones públicas;
  - De los avisos de modificaciones a las convocatorias y bases de licitación pública
  - De los fallos de las licitaciones públicas y los cambios que sufran éstos en los supuestos que prevea la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
  - De los datos relevantes de los contratos que se precisan en el programa de captura correspondiente.
  - Notificación y Resolución de Inconformidades.
- El Organismo deberá generar en formato Word para Windows versión 2.0 o superior para su envío a COMPRANET, la siguiente información:
  - De las bases de las licitaciones públicas;
  - De las actas de las juntas de aclaraciones.
- Dicha convocatoria contendrá lo siguiente:
  - El nombre del Sistema de Transporte Colectivo, como entidad convocante;



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

01

VI

98

DE

73

- La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando el documento que tenga las bases implique un costo, éste será fijado solo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria así como su inclusión en el sistema COMPRANET y de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo, el cual será requisito para participar en la licitación;
  - La fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones;
  - La indicación de si la licitación es nacional o internacional, si se realizará bajo la cobertura de algún Tratado, y el idioma o idiomas en que podrán presentarse las proposiciones;
  - La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrá subcontratarse parte de la obra;
  - Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos;
  - La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características de la obra, y demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados;
  - La información sobre los porcentajes a otorgar por conceptos de anticipos y su aplicación (hasta 10% para inicio de la obra y hasta 20% para la compra de materiales).  
En caso de que el monto de los anticipos sea superior a lo señalado en el punto anterior, se requerirá de la autorización por escrito del Director General o de la persona en quien este haya delegado por escrito tal facultad, de acuerdo a la normatividad vigente.
  - Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato.
- Previamente al inicio de cada ejercicio presupuestal, tanto las bases de la licitación como el modelo de contrato de obra pública y de servicios relacionados con la misma, deberán ser puestos a consideración de la Contraloría Interna y de la Gerencia Jurídica para su validación.
  - Las bases que emita el Organismo para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria o su inclusión a COMPRANET y hasta siete días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, y contendrán como mínimo lo siguiente:



CIUDAD DE MÉXICO

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

01

VI

98

DE 73

- Nombre del Sistema de Transporte Colectivo, como entidad convocante;
- Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia por parte de los interesados a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las proposiciones, comunicación del fallo y firma del contrato;
- Señalamiento de que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación;
- El idioma o idiomas en que podrán presentarse las proposiciones;
- La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los contratistas, podrán ser negociadas;
- Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes;
- Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción aplicables; catálogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo, de los cuáles deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores;
- Relación de materiales y equipo de instalación permanente, que en su caso proporcione el organismo;
- Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal;
- Experiencia, capacidad técnica y financiera y demás requisitos que deberán cumplir los interesados;
- Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;
- Datos sobre la garantía de la seriedad en la proposición, porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concedan;



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

DIRECCION DE OPERACION

**SISTEMA:**

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

01

VI

98

DE 73

- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de diez días naturales contados a partir de la publicación de la convocatoria, ni menor de siete días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
- Información específica sobre las partes de la obra que podrán subcontratarse;
- El registro actualizado de la Cámara que le corresponda (en su caso).
- Fecha de inicio de los trabajos y fecha estimada de terminación;
- Modelo de contrato;
- Condiciones de precio y, tratándose de contratos celebrados a precio alzado, las condiciones de pago.
- Procedimiento de ajuste de costos.
- Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones que contengan las bases de la licitación, deberán ser los mismos para todos los participantes.
- Lugar, fecha y hora para la junta de aclaraciones, en la que se elaborará una minuta de la reunión, señalando en su contenido las respuestas a las preguntas presentadas, de acuerdo a las bases de la licitación, por los participantes, así como las aclaraciones realizadas y de la cual se dará una copia a cada uno de los participantes.
- La venta de la documentación en los concursos de obra pública, se realizará contra la presentación de la Carta de Aceptación de Participación y mediante cheque certificado o de caja a nombre del Sistema de Transporte Colectivo o en efectivo, mismos que deberán ser entregados en el Departamento de Ingresos de la Gerencia de Recursos Financieros. La forma de pago de COMPRANET se efectuará a través de los formatos de pago y el procedimiento que establece dicho sistema.
- Todos los documentos legales que presenten los Contratistas deberán estar de acuerdo con su Acta Constitutiva y su documentación protocolizada vigente.
- El acto de presentación de documentos y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los licitantes que hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria y cubierto el costo de las bases de la licitación se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:
  - La proposición que el concursante deberá entregar en el acto de presentación y apertura, se hará mediante la entrega de dos sobres cerrados por separado, los cuales contendrán, el



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

01

VI

98

DE

73

primero de ellos, la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica, incluyendo en éste último la garantía de seriedad de la propuesta y se desecharán las que hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos.

- Durante el acto de apertura de proposiciones técnicas se señalarán fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la segunda etapa de la licitación, correspondiente a la apertura de la propuesta económica.
  - Durante el acto de apertura de proposiciones económicas, se señalarán fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. Esta fecha quedará comprendida dentro de los 40 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa y podrá ser diferida por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de cuarenta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.
- Para efectos del presente procedimiento y de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual de Obras del S.T.C., los documentos que integrarán las propuestas técnica y económica, serán los siguientes:

## PROPUESTA TECNICA:

- Documento 1A. Carta poder simple con la que el postor acredita la personalidad de su representante o en su caso, carta con la que el Postor manifiesta su personalidad dentro de la compañía.
- Documento 2A. Escritura Constitutiva de la compañía o acta de nacimiento en su caso.
- Documento 3A. Registro completo y actualizado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, o en su caso, el de la Cámara a que corresponda, en caso de estar inscrito o afiliado.
- Documento 4A. Pliego de requisitos.
- Documento 5A. Datos básicos
  - a) De materiales puestos en obra.
  - b) De maquinaria y equipo de construcción puestos en obra, con su respectivo análisis de costo horario.
  - c) De mano de obra, con su respectivo cálculo del factor de salario real.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

01

VI

98

DE 73

- Documento 6A. Programas
  - a) Calendarizado de ejecución de los trabajos.
  - b) Calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.
  - c) Calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
  - d) Calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
  - e) Calendarizado de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente..
- Documento 7A. Relación de maquinaria y equipo de construcción propio y/o rentado, así como su ubicación física y vida útil.
- Documento 8A. Relación de contratos en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública Federal o con particulares, indicando el monto contratado y el monto por ejercer, y documentación que acredite la experiencia o capacidad técnica en trabajos similares.
- Documento 9A. Modelo de Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.
- Documento 10A. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren, y en su caso, circulares aclaratorias.

## PROPUESTA ECONOMICA:

- Documento 1B. Datos y Análisis Básicos:
  - a) Relación de conceptos de los que deberá presentar análisis detallado de precios unitarios.
  - b) Instructivo para el análisis detallado de precios unitarios.
  - c) Desglose del cargo indirecto y análisis para la determinación del cargo indirecto.
  - d) Análisis detallado del cargo por financiamiento.
  - e) Análisis del costo horario de la maquinaria y equipo.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

01

VI

98

DE 73

f) Análisis detallado de precios unitarios.

g) Representación de la explosión de insumos.

- Documento 2B. Programas

a) De montos mensuales de ejecución de los trabajos.

b) De montos mensuales de utilización del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

c) De montos mensuales de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

d) De montos mensuales de utilización de la maquinaria y equipo de construcción.

e) De montos mensuales de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.

- Documento 3B. Catálogo de conceptos y cantidades de obra.

- Documento 4B. Escrito proposición.

- Documento 5B. Resumen por partidas.

- Documento 6B. Garantía de sostenimiento de la proposición, que será definida por la Unidad de Obra Pública de acuerdo con la normatividad vigente y a los lineamientos que emita el Comité de Obras.

– Bajo su responsabilidad la Unidad de Obra Pública convocante, para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones y elaborar el dictamen a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, deberá considerar:

A. En los aspectos preparatorios para el análisis comparativo de las proposiciones:

- **En el aspecto técnico:**

1. Constatar que en las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, será motivo para desechar la propuesta, y



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

01

VI

98

DE 73

2. Verificar que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado correspondiente, sean de las requeridas por el Organismo.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores se calificarán como solventes técnicamente y, por tanto, sólo éstas serán consideradas en la segunda etapa del acto de apertura, debiéndose desechar las restantes. La Unidad de Obra Pública emitirá una resolución al respecto, en la que se hará constar las causas que motivaron desecharlas.

## ◦ En el aspecto económico

1. Revisar que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos, considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente, que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga, y que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de los anticipos.

La integración de los precios unitarios deberá ajustarse a lo previsto en los oficios-circulares publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 19 de enero y 13 de junio de 1994, destacándose que los cargos por concepto de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de los derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Contraloría General del Distrito Federal, se adicionarán a la cantidad que resulte de la suma de los costos directos, indirectos, de financiamiento y del cargo por utilidad. Deberá requerirse a los interesados que en sus propuestas incluyan los tres conceptos primeramente mencionados dentro del rubro de utilidad, indicando su monto.

Dichos criterios, en ningún caso, podrán contemplar calificaciones por puntos o porcentajes.

B. En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo:



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

01

VI

98

DE 73

1. Elaborar un Dictamen, con base únicamente en el resultado del análisis comparativo de las proposiciones no desechadas, que servirá como fundamento para que el servidor público correspondiente emita el fallo de la licitación, y
  2. Señalar en el Dictamen mencionado los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones, en su caso, los lugares correspondientes a los participantes cuyas propuestas hayan satisfecho la totalidad de los requerimientos de la convocante, indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones desechadas con las causas que originaron su exclusión. El mismo día en que se comunique el fallo, o adjunta a la comunicación a la que se refiere el artículo 58, fracción VII de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se entregará por separado a cada participante, un escrito en el que se expliquen las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora, o los motivos por los que, en su caso, haya sido desechada.
- Las propuestas que no hayan sido aceptadas se devolverán a los Contratistas respectivos en un plazo de quince días naturales a partir de la fecha en que se celebre el Acto de Fallo.
  - En los procesos para la contratación de obra pública, la Unidad de Obra Pública convocante optará, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de los bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados.
  - El contrato se adjudicará a la persona que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Organismo, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
  - Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos del Organismo, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
  - En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarará desierta la licitación, y se procederá a expedir una nueva convocatoria.
  - La Unidad de Obra Pública, a través de la sección especializada del Diario Oficial de la Federación a que se refiere el artículo 32 de la Ley, harán del conocimiento general la identidad del participante ganador de cada licitación pública. Esta publicación contendrá los requisitos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

01

VI

98

DE 73

- Las Compañías o Contratistas que participen en las licitaciones o celebren contratos a que se refiere el presente procedimiento, deberán garantizar:
  - La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de licitación pública.

El organismo conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en que serán devueltas a los licitantes, salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente;
  - Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto del anticipo;
  - El cumplimiento de los contratos.
- Las garantías previstas en los primeros dos puntos del inciso anterior, deberán presentarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el contratista reciba copia del fallo de adjudicación; y el o los anticipos correspondientes se entregarán, a más tardar, dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía.
- En los casos de licitación mediante convocatoria pública se invitará a la Contraloría General del Distrito Federal.
- Formará parte de las estipulaciones del propio contrato lo referente a:
  - La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato.
  - El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.
  - La fecha de iniciación y terminación de los trabajos.
  - Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos para inicio de las obras para compra o producción de los materiales.
  - Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

01

VI

98

DE 73

- Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, así como de los ajustes de costos.
- Montos de las penas convencionales.
- Forma en que el Contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el segundo párrafo del Artículo 69 de la Ley.
- Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser determinado desde las bases de la licitación por el organismo, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato.
- La descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, debiendo acompañar, como parte integrante del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes.
- En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán controversias futuras y previsibles que pudieren versar sobre problemas de carácter técnico y administrativo.
- La adjudicación del contrato obligará al Organismo y al Contratista a formalizar el documento relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la celebración del Acto de Fallo.
- Cuando el Contratista no firme el contrato dentro del plazo establecido, perderá en favor del Organismo la garantía que hubiere otorgado, y éste podrá, sin necesidad de un nuevo proceso, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de acuerdo con el Dictamen, y así sucesivamente en caso de que éste último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiera resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al diez por ciento.
- En caso de que no se cubra los requisitos establecidos en el punto anterior, la Unidad de Obra Pública convocante procederá a preparar otra licitación pública.
- La Unidad de Obra Pública convocante solicitará al Contratista entregar una fianza de cumplimiento a favor del organismo con valor del 10% del monto total del contrato y fianza por el valor total del anticipo que garantice la debida inversión del mismo. En ambos casos la



CIUDAD DE MÉXICO

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

DIRECCION DE OPERACION

**SISTEMA:**

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

01

VI

98

DE 73

fianza será expedida por una Institución Afianzadora legalmente constituida, y a nombre del Sistema de Transporte Colectivo.

- La Unidad de Obra Pública convocante tramitará los anticipos en un plazo no mayor a quince días naturales contados a partir de la fecha en que el Contratista hubiera entregado las fianzas correspondientes.
- La Unidad de Obra Pública convocante oportunamente hará entrega al Contratista de los inmuebles correspondientes para que inicie las obras.
- La Unidad de Obra Pública convocante podrá realizar modificaciones a los contratos de obra pública en apego a lo establecido en la normatividad aplicable vigente.
- El Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a la normatividad y ordenamientos vigentes y a los lineamientos establecidos por el Sistema de Transporte Colectivo.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

01

VI

98

DE 73

| No | UNIDAD ADMINISTRATIVA          | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNIDAD DE OBRA PUBLICA         | (VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRA PUBLICA)<br><br>Elabora la convocatoria de la Licitación Pública indicando las características de la obra y requisitos de participación, realiza ante el Departamento de Relaciones Públicas del organismo los trámites para su publicación en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación, y envía a la SECODAM para su inclusión en el sistema COMPRANET.                                                    |
| 2  |                                | Elabora oficio en original y copia para la invitación a la Contraloría General del D.F., a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a la Contraloría Interna, a la Gerencia Jurídica, a la Gerencia de Recursos Financieros y al Area Solicitante, indicando la fecha, el lugar y la hora de los actos de apertura de propuestas y de fallo y distribuye:<br>Original de los Oficios.- Dependencias mencionadas.<br>Copia.- Archivo. Acuse.                                                      |
| 3  | UNIDAD DE OBRA PUBLICA SECODAM | Realiza la venta de documentos a los interesados en participar que hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria y las bases de la licitación, así como lo establecido en la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  |                                | En el día y hora señalados en la convocatoria, lleva a cavo la visita de obra, para que conjuntamente con el área responsable de la coordinación y supervisión de los trabajos se efectúe el recorrido correspondiente, así mismo en el día y hora establecidos realiza la junta de aclaraciones, para que en caso de existir dudas de los participantes sobre las bases, especificaciones o en general sobre los trabajos a realizar, se asienten en la minuta que se levantará en esta reunión, la que se le |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

01

VI

98

DE 73

| No  | UNIDAD ADMINISTRATIVA           | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA          | entregará a cada uno de los participantes con las respuestas necesarias, turnando también a la SECODAM para su inclusión en el sistema COMPRANET.                                                                                               |
| 6   | LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL | Realiza en la fecha, hora y sitio indicado, la apertura de propuestas.                                                                                                                                                                          |
| 7   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA          | Entrega a la Unidad de Obra Pública la propuesta tanto técnica como económica, en sobres cerrados, en la junta pública conforme se les nombre.                                                                                                  |
| 7.1 |                                 | Recibe los sobres y procede a la apertura del sobre que corresponda a la propuesta técnica de cada postor, revisa que cada sobre contenga todos los documentos solicitados.<br>Cumple con los requisitos?                                       |
| 7.2 |                                 | No, se le indica al postor las causas que motivaron su desecho, asentándolo en el Acta correspondiente, y devuelve la documentación al postor en el plazo establecido en las bases.                                                             |
| 8   |                                 | Sí, procede a recabar la firma de los postores y de los representantes del Organismo en los documentos 5A, 6A, y 7A.                                                                                                                            |
| 9   |                                 | Elabora acta en la que se hace constar las propuestas técnicas aceptadas y desechadas, indicando los motivos de estas últimas, y separa los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas para su resguardo.                          |
|     |                                 | Recaba firma de los participantes en el acta y en los sobres de las propuestas económicas, indicando el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas, y distribuye de la siguiente manera: |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

01

VI

98

DE 73

| No | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | UNIDAD DE OBRA PUBLICA                                                                                 | <p>Original del acta y de propuestas aceptadas y desechadas.- Unidad de Obra Pública.- Expediente de Licitación.</p> <p>Copia del Acta.- Contraloría General del D.F. y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.</p> <p>Copia del Acta.- Gerencia Jurídica.</p> <p>Copia del Acta.- Area Beneficiaria.</p> <p>Copia del Acta.- Contraloría Interna.</p> <p>Copias del Acta.- A cada participante.</p> <p>Integra el original del acta al expediente de la licitación, y de las propuestas técnicas aceptadas, en el caso de las Gerencias de Línea entrega las propuestas técnicas aceptadas al Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos y en el caso del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública entrega a la Subjefatura de Costos de Obra Pública los documentos 5A, 6A y 7A y conserva los demás para su revisión.</p> |
| 11 | SUBJEFATURA DE COSTOS DE OBRA PUBLICA<br>DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ADMÓN. DE RECURSOS | <p>Recibe documentos de las propuestas técnicas aceptadas, los revisa, analiza y anota las observaciones en el formato "Evaluación de la Solvencia Técnica de las Propuestas", conserva el primero y en el caso de la Subjefatura de Costos de Obra Pública, entrega al Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales los documentos 6A y 7A , el formato de "Revisión de Programas Calendarizados y Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción Propio y/o Rentado", y conserva el 5A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | DEPTO. DE EVALUACION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS GENERALES                                   | <p>Recibe documentos 6A y 7A, y formato, revisa que cumplan con lo requerido por el Organismo y anota los comentarios al respecto en el formato y en el caso del Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales, lo regresa a la Subjefatura de Costos de Obra Pública, junto con los documentos 6A y 7A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

01

VI

98

DE 73

| No   | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | SUBJEFATURA DE COSTOS DE OBRA PUBLICA | Recibe la documentación con las observaciones realizadas, las revisa e integra a los documentos de la propuesta técnica, y en el caso de la Subjefatura de Costos de Obra Pública la entrega al Depto. de Licitación y Costos de Obra Pública.                                                                                                                               |
| 14   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA                | Recibe las observaciones realizadas a cada una de las propuestas técnicas, las analiza y determina qué postores podrán continuar en la siguiente etapa de la licitación, así como los que se desechan.                                                                                                                                                                       |
| 15   |                                       | Elabora la Resolución, en la que se indica qué postores podrán seguir en el proceso de la licitación, así como los que no y las causas que motivaron su desecho; asimismo, prepara para cada uno de los postores cuyas propuestas técnicas no fueron aceptadas en la revisión detallada, la carta en la que se les informa la causa que motivó su desecho.                   |
| 16   |                                       | El día y hora señalados en la primera etapa, da a conocer la resolución de los postores que podrán continuar en el proceso de la licitación, entrega los originales de las cartas a los postores cuyas propuestas técnicas fueron desechadas y procede a la apertura de las propuestas económicas de los postores que cumplieron con los requisitos de la propuesta técnica. |
| 17   |                                       | Abre los sobres, revisa que contengan todos los documentos solicitados.<br>Cumplen con los requisitos?                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.1 |                                       | No, se le indica al postor las causas que motivaron su desecho, asentándolo en el Acta correspondiente, y devuelve la documentación al postor en el plazo establecido en las bases.                                                                                                                                                                                          |



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

01

VI

98

DE 73

| No   | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.2 |                                                                                                        | Sí, lee en voz alta el importe de la propuesta, recaba firma de los postores y de los representantes del Organismo en el documento 3B y entrega a cada uno de los postores aceptados el recibo por la garantía otorgada para sostenimiento de la propuesta.                                                                                                                                                                            |
| 18   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA                                                                                 | Elabora acta en la que se hace constar las propuestas económicas aceptadas así como las que no y el motivo que originó su desecho, recaba firma de los participantes, indicando el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.                                                                                                                                                                             |
| 19   |                                                                                                        | Integra original del acta al expediente de licitación y en el caso de las Gerencias de Línea entrega las propuestas económicas aceptadas al Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos correspondiente, y en el caso del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, envía a la Subjefatura de Costos de Obra Pública para la evaluación los documentos que integran la propuesta económica. |
| 20   | SUBJEFATURA DE COSTOS DE OBRA PUBLICA<br>DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ADMÓN. DE RECURSOS | Recibe documentación, la evalúa y anota los datos en el formato "Evaluación de la Solvencia Económica de las Propuestas" y "Resumen del Análisis de las Propuestas Recibidas", realiza las observaciones correspondientes y entrega a la Gerencia de Línea o al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, según corresponda.                                                                                                |
| 21   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA                                                                                 | Recibe la documentación, la revisa y analiza y elabora el Dictamen con base únicamente en el resultado comparativo de las propuestas no desechadas y en el caso del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, lo presenta a la Dirección de Operación.                                                                                                                                                                      |



CIUDAD DE MÉXICO

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

01

VI

98

DE 73

| No   | UNIDAD ADMINISTRATIVA                       | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22   | DIRECCION DE OPERACION<br>GERENCIA DE LINEA | Recibe dictamen de licitación y con fundamento en él determina el fallo que se emitirá ante las autoridades, invitados y postores participantes.                                                                                                                                                                           |
| 23   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA                      | El día y hora señalados en la segunda etapa, da a conocer el fallo de la licitación, indicando el nombre del postor a quien se le adjudicó el contrato correspondiente o si se decidió declarar desierta la licitación y devuelve los cheques de garantía a los postores que no resultaron beneficiados.<br>¿Hubo ganador? |
| 23.1 |                                             | No, se procede a preparar nuevas invitaciones.<br>(Reinicia procedimiento en la actividad N° 1).                                                                                                                                                                                                                           |
| 23.2 |                                             | Sí, cita al Contratista ganador para la firma del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24   |                                             | Elabora el Acta de fallo, recaba firma de los participantes y de los representantes del organismo, obtiene copias y distribuye a cada uno de los participantes.                                                                                                                                                            |
| 25   |                                             | Elabora el aviso de fallo y realiza ante el Departamento de Relaciones Públicas del Organismo los trámites para su publicación de la sección especializada del Diario Oficial de la Federación y envía a la SECODAM para su inclusión en el sistema COMPRANET.                                                             |
| 26   |                                             | Elabora el contrato de obra pública en original y 5 copias.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27   |                                             | Recibe al contratista para firma del contrato, le entrega copia fotostática del mismo para el trámite de las fianzas respectivas.                                                                                                                                                                                          |
| 28   | CONTRATISTA                                 | Tramita fianzas y las presenta a la Unidad de Obra Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                |



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

01

VI

98

DE 73

| No   | UNIDAD ADMINISTRATIVA   | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA  | Recibe las fianzas de cumplimiento y por anticipo en original y seis copias, sella una de acuse de recibo, que devuelve al Contratista y conserva los demás ejemplares.                                                                        |
| 30   |                         | Elabora "Registro y Control de Autorizaciones" en original y tres copias, recabando firma de autorización de la Dirección de Operación o Gerencia de Línea en su caso, y de la Gerencia de Contabilidad, y turna a la Gerencia de Presupuesto. |
| 31   | GERENCIA DE PRESUPUESTO | Recibe la relación y verifica que la obra que se va a realizar cuente con presupuesto suficiente dentro del programa autorizado.                                                                                                               |
| 32   |                         | Firma de autorización presupuestal original y copias de la relación y turna a la Unidad de Obra Pública, conservando la copia n° 1.                                                                                                            |
| 33   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA  | Recibe la relación en original y copias N° 2 y 3 y conserva.                                                                                                                                                                                   |
| 34   |                         | Envía contrato en original y 5 copias a la Gerencia Jurídica para su revisión y autorización.                                                                                                                                                  |
| 35   | GERENCIA JURIDICA       | Recibe contrato y verifica:<br>Cumple con la normatividad establecida?                                                                                                                                                                         |
| 35.1 |                         | No, devuelve el contrato a la Unidad de Obra Pública para efectuar las correcciones del caso.<br>(Reinicia procedimiento en la Actividad N° 26)                                                                                                |
| 35.2 | GERENCIA JURIDICA       | Sí, rubrica contrato y lo devuelve a la Unidad de Obra Pública                                                                                                                                                                                 |
| 36   | UNIDAD DE OBRA PUBLICA  | Recibe el contrato, anexa relación del "Registro y Control de Autorizaciones" en original y copias N° 2 y 3 y envía a la Dirección de Operación.                                                                                               |



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

01

VI

98

DE 73

| No   | UNIDAD ADMINISTRATIVA  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37   | DIRECCION DE OPERACIÓN | Recibe documentación y verifica que los contratos se apeguen a lo establecido, quedándose con la copia N°. 2 del "Registro y Control de Autorizaciones".<br>¿Se apegan a lo establecido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37.1 |                        | No, devuelve el "Registro y Control de Autorizaciones" y el "Contrato" a la Unidad de Obra Pública para que lo vuelva a formular.<br>(Reinicia procedimiento en Actividad N°. 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 37.2 | UNIDAD DE OBRA PUBLICA | Sí, firma el Contrato y presenta la documentación en la Dirección General para trámite de firma de autorización y posteriormente lo devuelve a la Unidad de Obra Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38   |                        | Recibe el contrato autorizado en original y 5 copias y la relación en original y copia N° 3 y localiza en su archivo las fianzas correspondientes para obtener fotocopias, y distribuye de la siguiente manera:<br>Originales de: Contrato, Relación y dos fotocopias de las Fianzas.- Unidad de Obra Pública.- Para su archivo y control.<br>Copia N° 1 del Contrato.- Contratista. Para su manejo.<br>Copia N° 2 del Contrato y copia de las fianzas.- Contraloría Interna. Para su conocimiento.<br>Copia N° 3 del Contrato, y original de las fianzas.- Gerencia Jurídica. Para su custodia.<br>Copia N° 4 del Contrato y copia de las fianzas.- Area Beneficiaria. Para su conocimiento.<br>Copia N° 5 del Contrato, N° 3 de la Relación, y copia de las fianzas.- Gerencia de Contabilidad. Para su trámite.<br>CONTINUA EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, Y PARA LA REVISION DE ESTIMACIONES Y GESTION DEL PAGO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA |



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

01


VI

98

DE 73

## UNIDAD DE OBRA PUBLICA

## CONTRATISTA

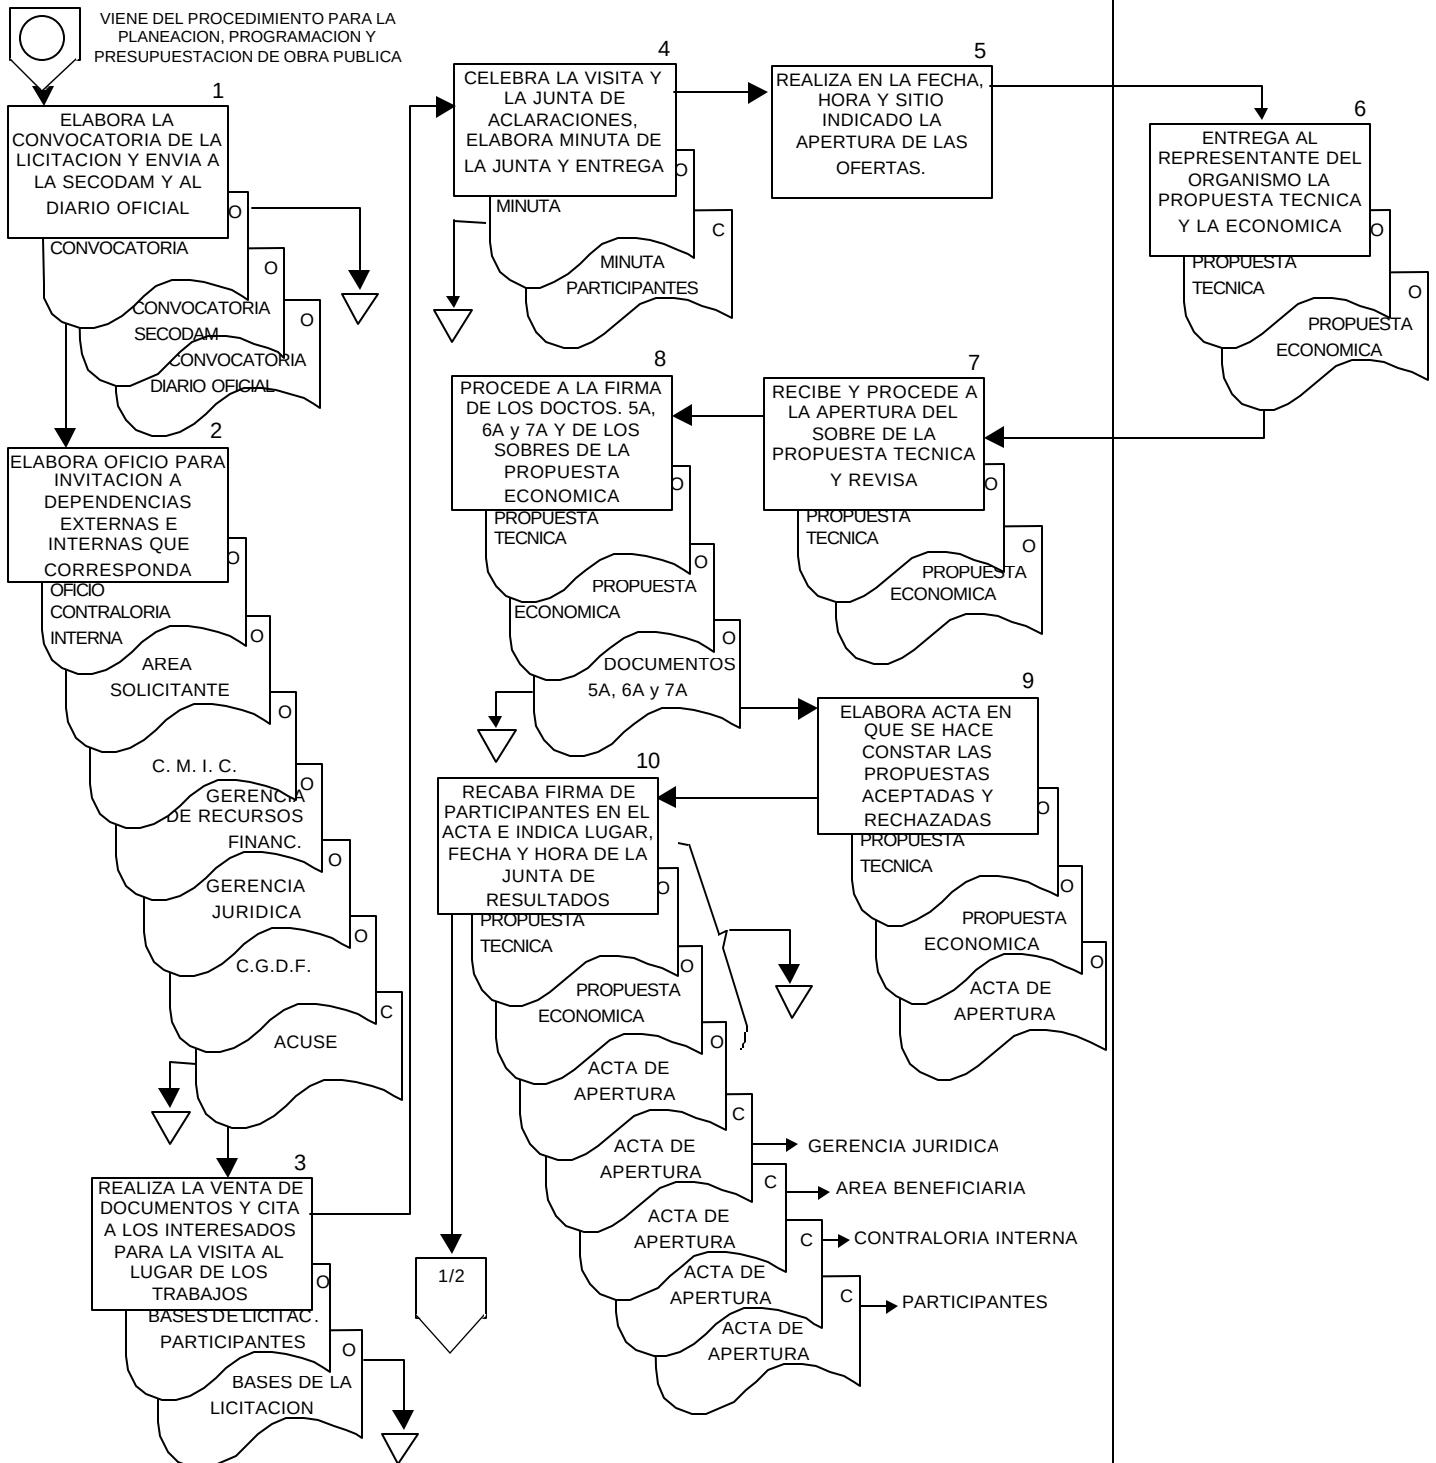



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

01

VI

98


DE 73

UNIDAD DE OBRA PUBLICA

DEPYMAG

JEFATURA

SUBJEFATURA DE COSTOS

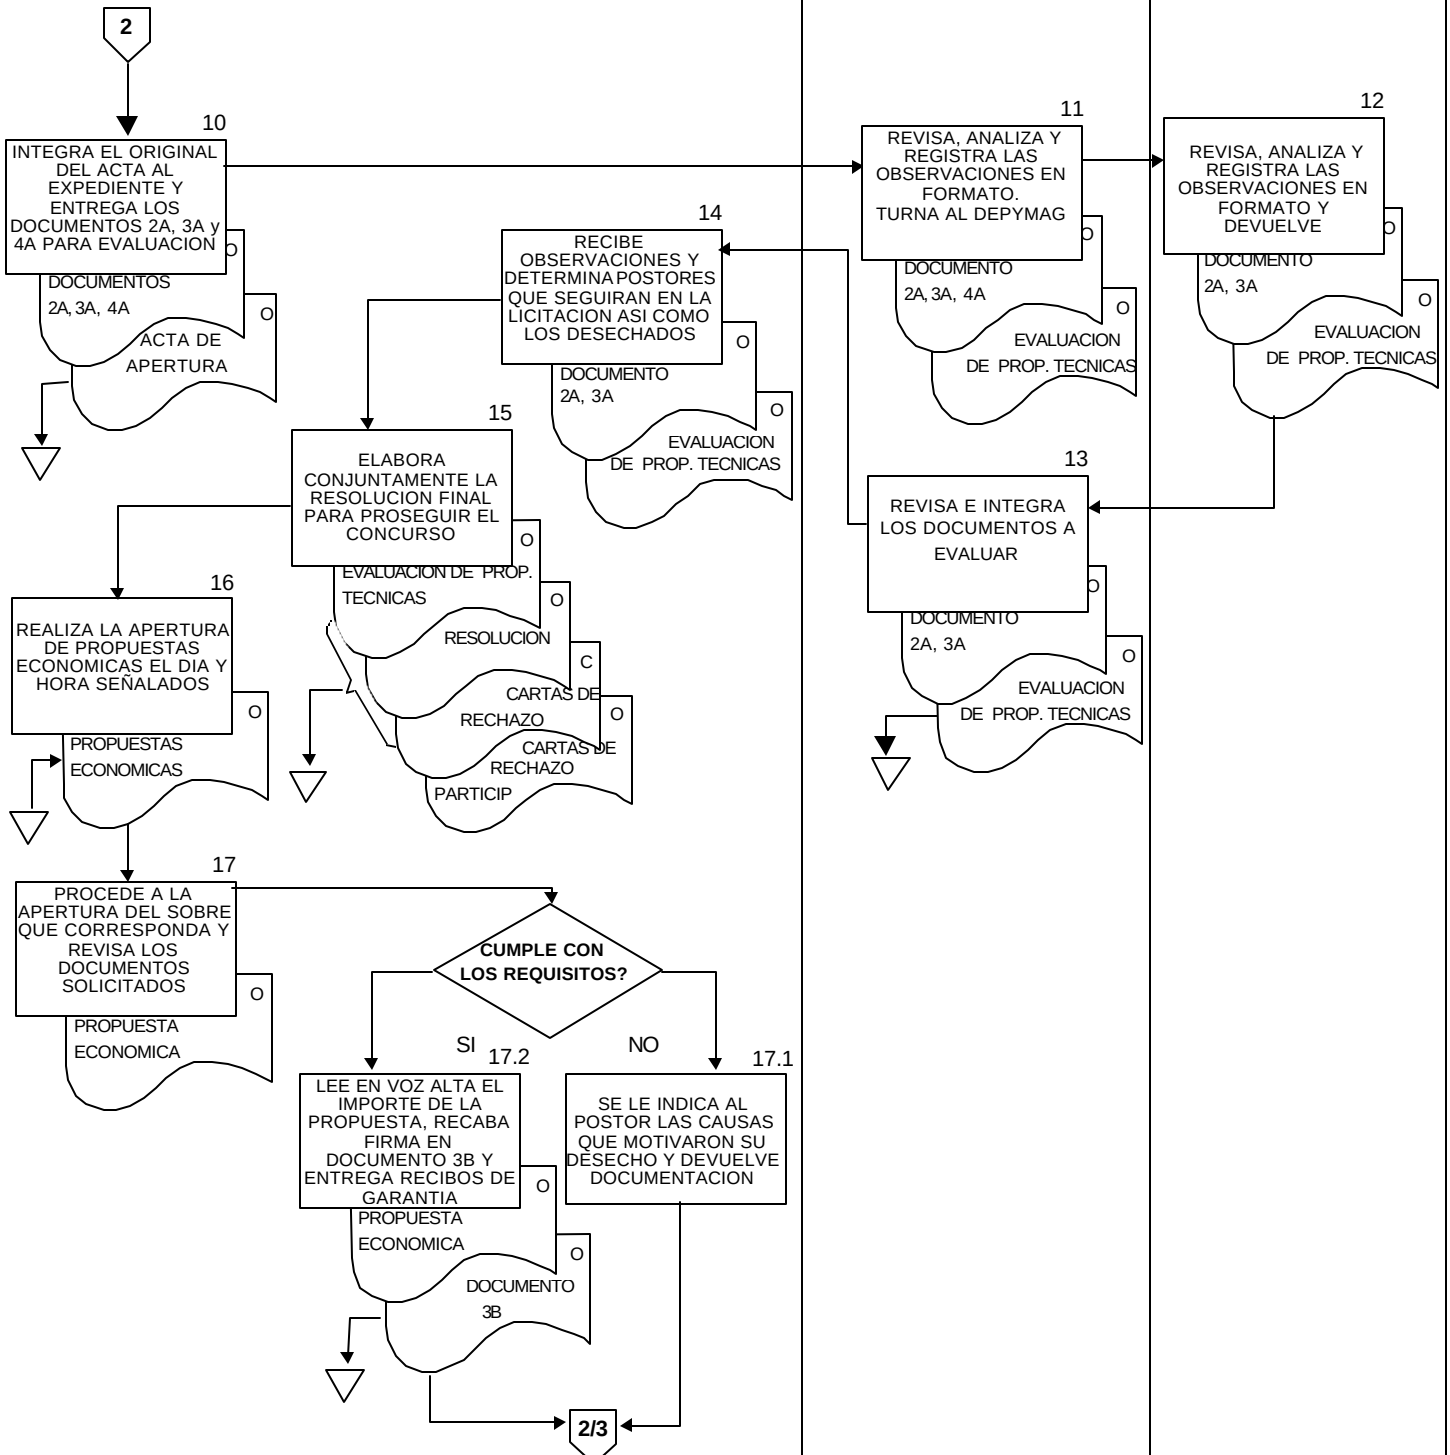



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

01

VI

98


DE 73

## UNIDAD DE OBRA PUBLICA

DIR. DE OPERACIÓN  
GERENCIA DE LINEA

### SUBJEFATURA DE COSTOS

### JEFATURA

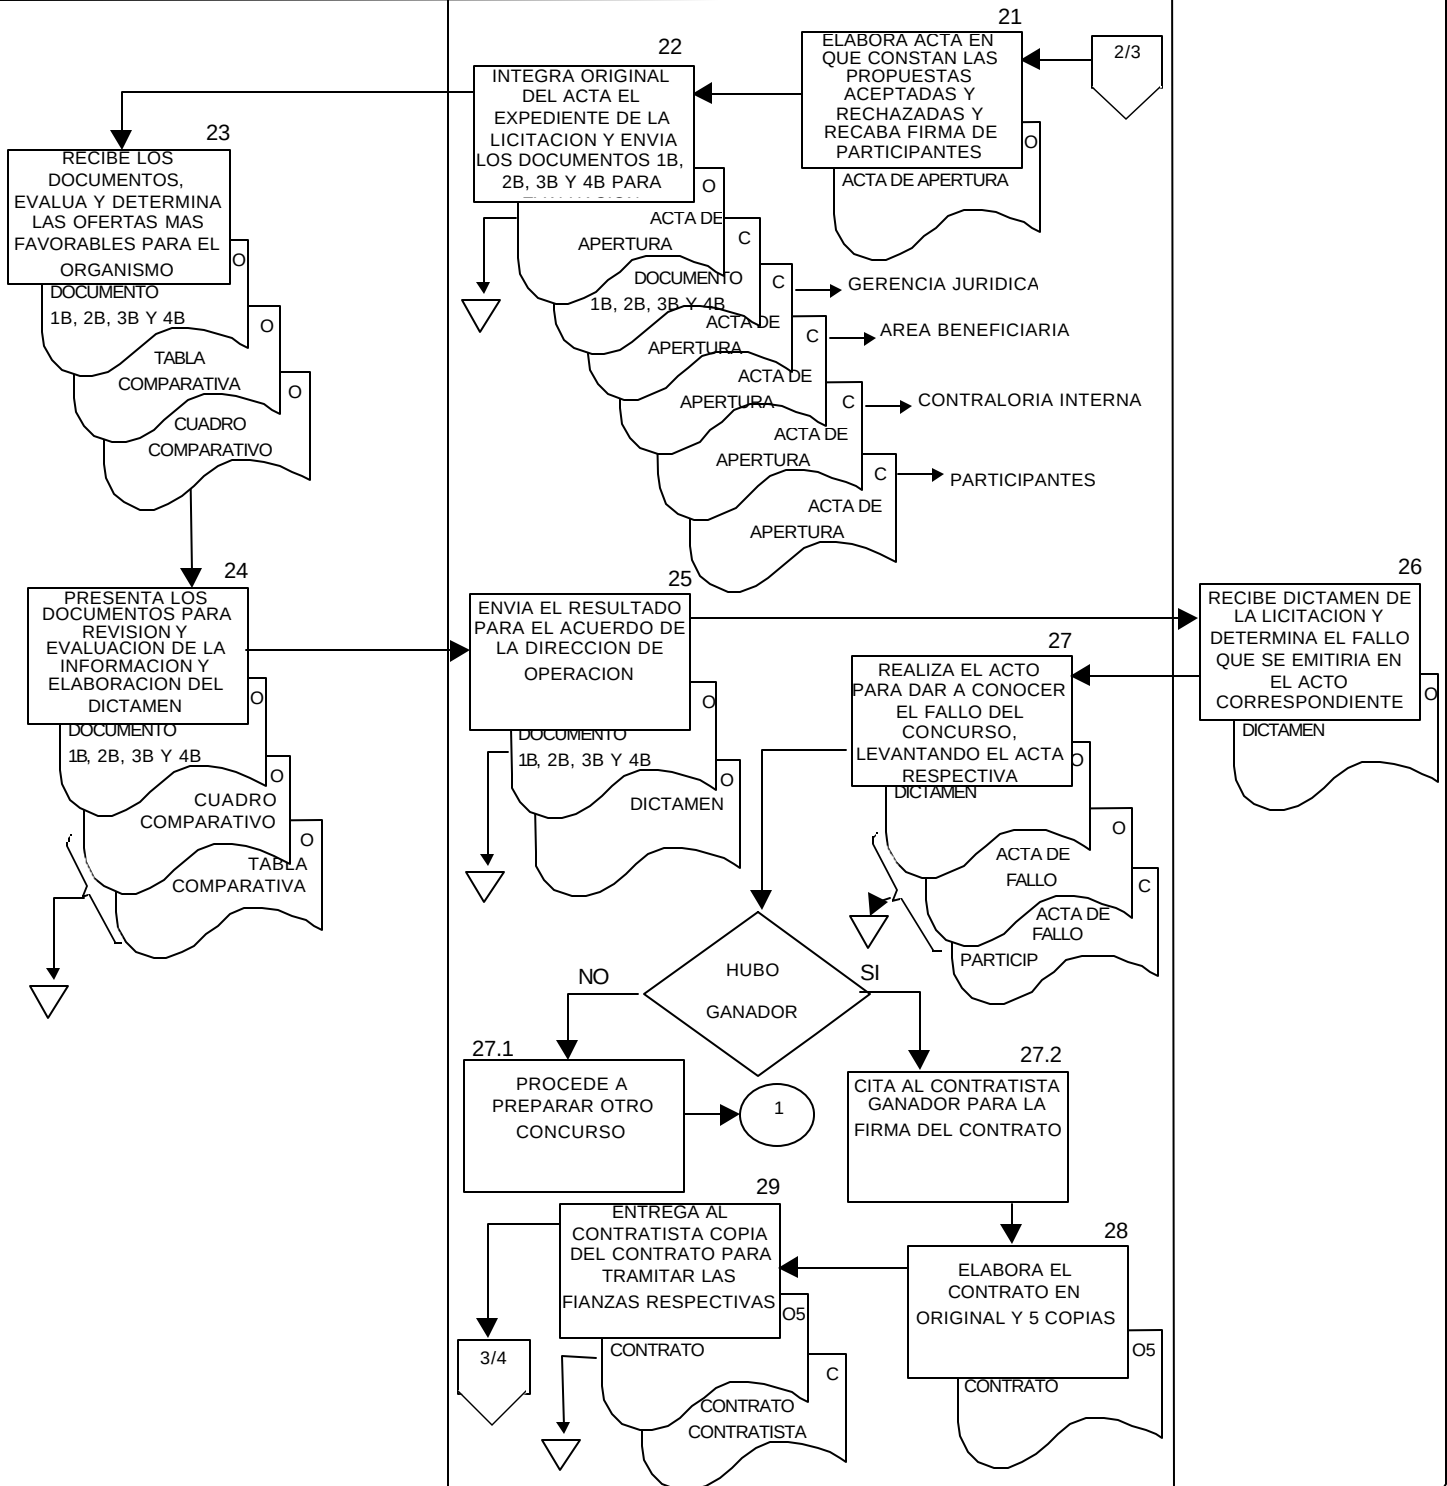



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA


PAG. 30

01

VI

98

DE 73

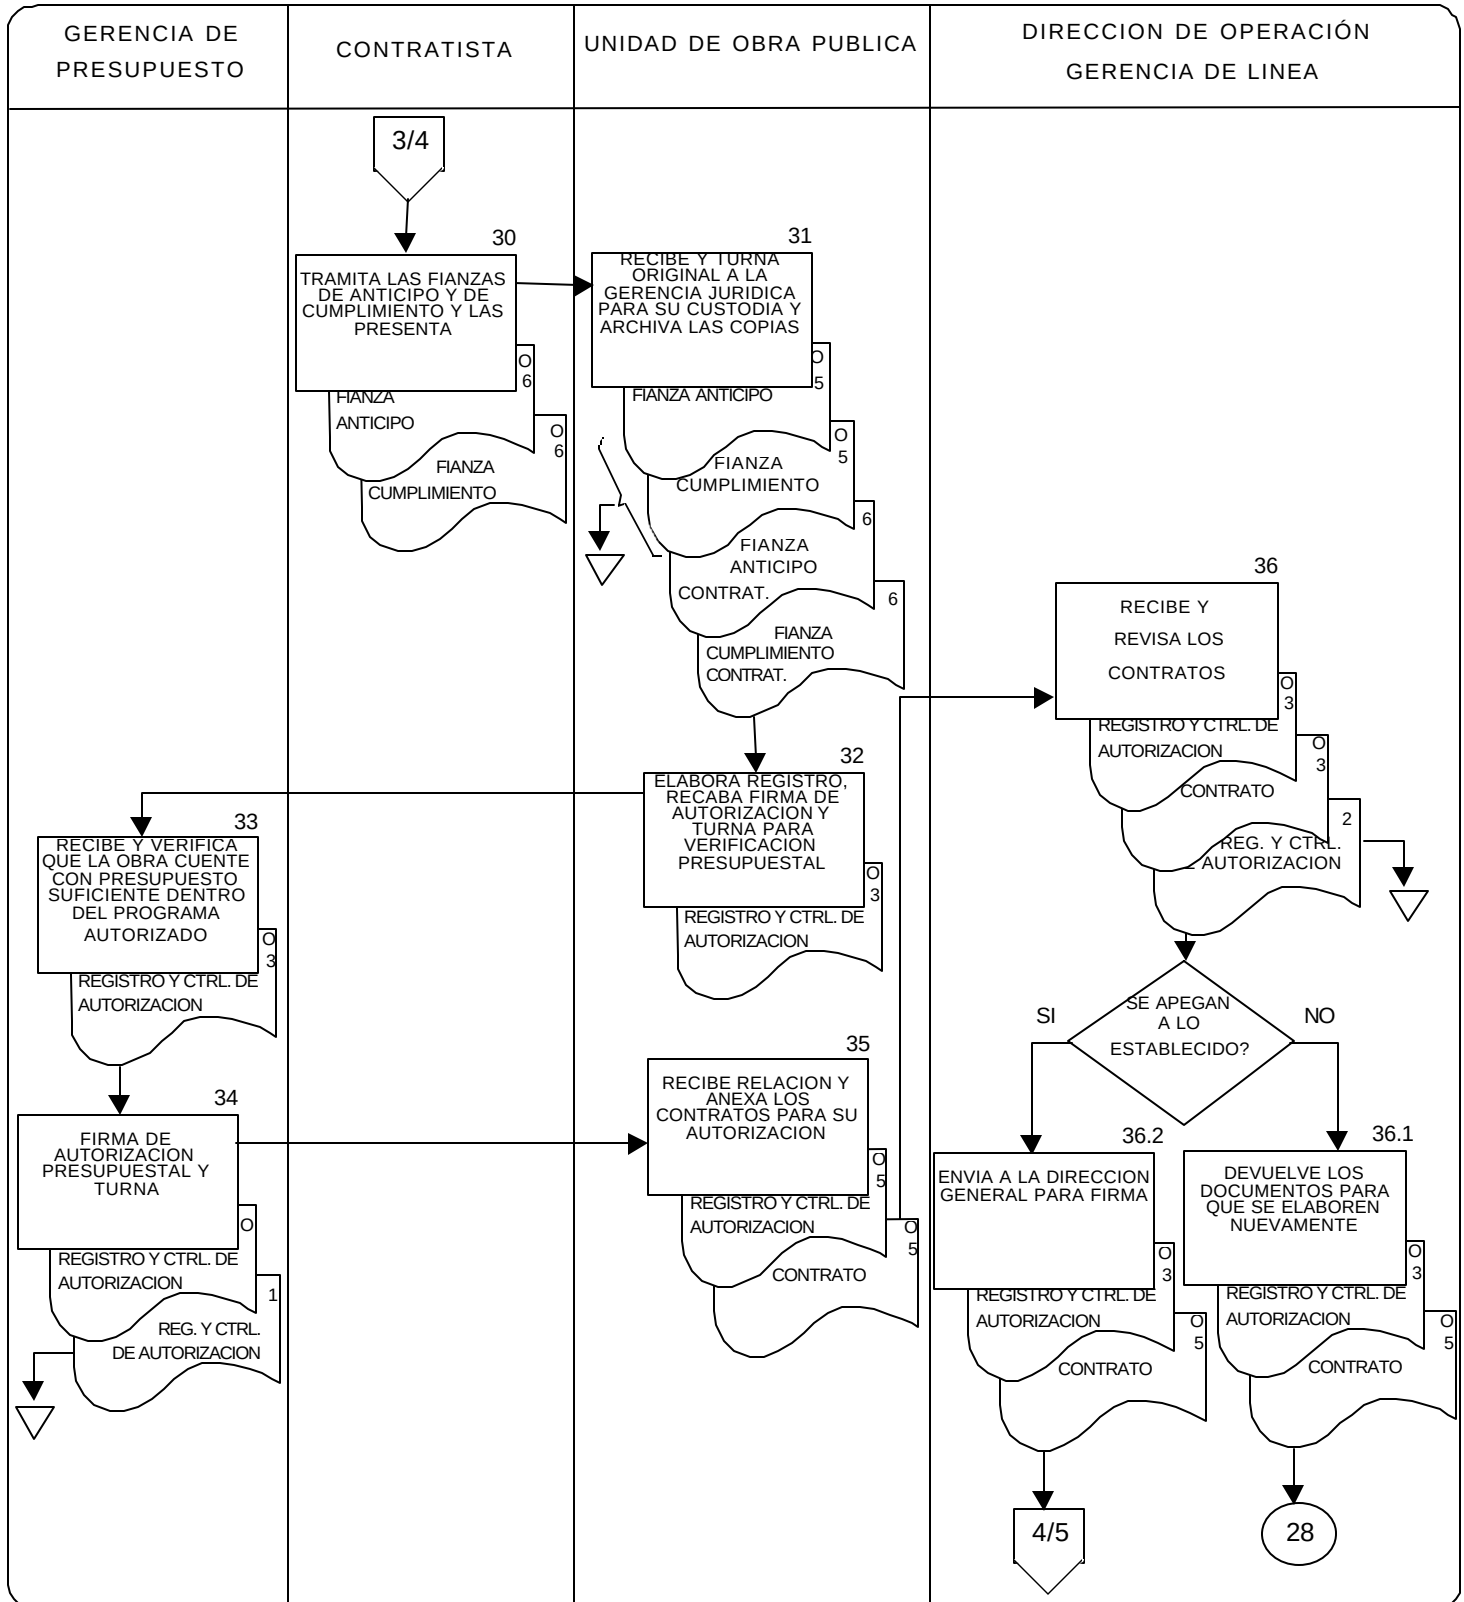



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31


01

VI

98

DE 73

## UNIDAD DE OBRA PUBLICA

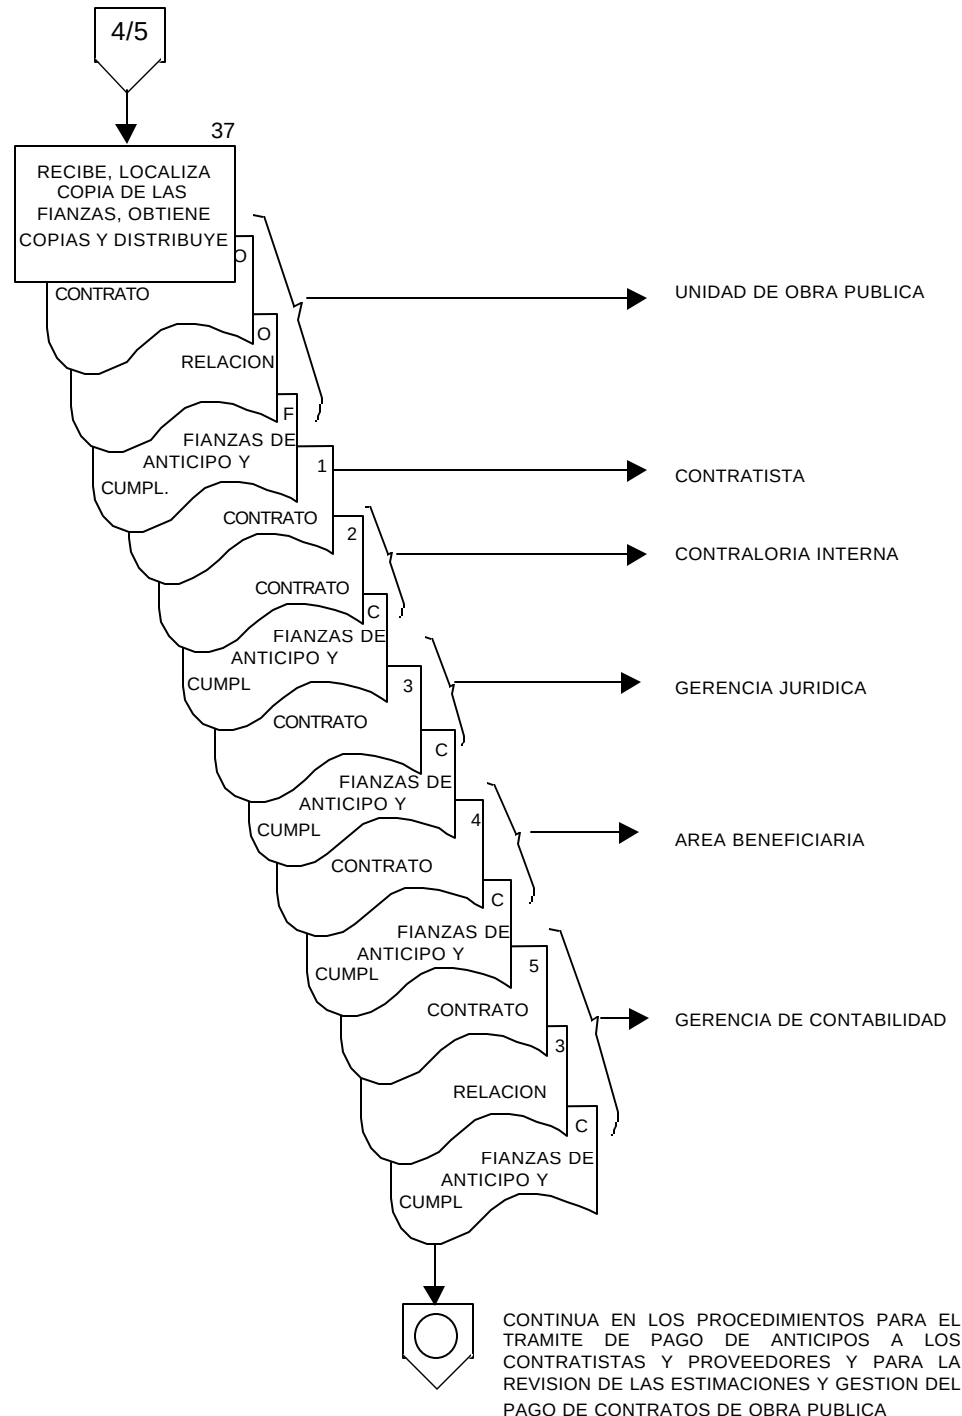



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

01

VI

98

DE 73

## RELACION DE FORMAS UTILIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO

- EVALUACION DE LA SOLVENCIA TECNICA DE LAS PROPUESTAS
- EVALUACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS
- RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS
- RESOLUCION
- DICTAMEN
- REGISTRO Y CONTROL DE AUTORIZACIONES
- REVISION DE PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PROPIO Y/O RENTADO
- CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTOS
- CUADRO DE PROCESO DE CONCURSO
- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
- INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS SEGÚN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

01

VI

98

DE

73

## EVALUACION DE LA SOLVENCIA TECNICA DE LAS PROPUESTAS



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

01

VI

98

DE

73

## EVALUACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### EVALUACION DE LA SOLVENCIA TECNICA DE LAS PROPUESTAS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados para los participantes en las licitaciones.

FORMULACION A CARGO DE: Unidad de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION: Mecanográfica y manual.

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Expediente de la licitación  
Copia.- Archivo.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### EVALUACION DE LA SOLVENCIA TECNICA DE LAS PROPUESTAS

| No | CONCEPTO        | SE DEBE ANOTAR                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OBRA PUBLICA    | La obra pública o los trabajos relacionados que son sujetos de la licitación                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | LICITACION      | La clave y número de la licitación.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | FECHA           | El día, mes y año en que se elabore la forma.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | DATO BASICO     | El nombre del dato básico a considerar en cada formato (mano de obra, materiales, equipo).                                                                                                                                                                                            |
| 5  | NOMBRE          | Cada uno de los conceptos que integran el dato básico.                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | UNIDAD          | La unidad de medida de cada concepto.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | PRECIO UNITARIO | El precio unitario correspondiente a cada concepto propuesto para cada contratista participante en la licitación, únicamente para efecto de verificar su consideración en la propuesta técnica.<br><br>La última columna será destinada para el S.T.C., y anotando la leyenda "100%". |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

01

VI

98

DE 73

## RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS

|                                       |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
|                                       |                      | OBRA:                                            |  |  |  | LICITACION: |  |
|                                       |                      |                                                  |  |  |  | FECHA:      |  |
|                                       |                      | RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS |  |  |  |             |  |
| CONCURSANTE                           |                      |                                                  |  |  |  | S.T.C.      |  |
| IMPORTE DE LA                         | ORIGINAL SIN IVA     |                                                  |  |  |  |             |  |
| PROPUESTA                             | CORREGIDA SIN IVA    |                                                  |  |  |  |             |  |
| PORCENTAJE RESPECTO AL S.T.C.         |                      |                                                  |  |  |  | 100 %       |  |
| FECHA DE TERMINACION PROPUESTA        |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| CALENDARIO DE TRABAJO                 |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| RELACION DE EQUIPO                    |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| % COSTOS INDIRECTOS UTILIDAD Y FINAN. |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| DATOS                                 | MONTO ANALIZADO C.D. |                                                  |  |  |  |             |  |
| BASICOS                               |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS         |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| OBSERVACIONES                         |                      | DICTAMEN                                         |  |  |  |             |  |
| PARTICIPANTES                         |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| CONTRATISTAS:                         |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| PROPUESTAS RECIBIDAS:                 |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| PROPUESTAS DESECHADAS                 |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| SE DISCULPARON                        |                      |                                                  |  |  |  |             |  |
| NO SE PRESENTARON                     |                      |                                                  |  |  |  |             |  |

|                                |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
|                                |                      | OBRA:                                            |               |               |               | LICITACION: |  |
|                                |                      |                                                  |               |               |               | FECHA:      |  |
|                                |                      | RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS |               |               |               |             |  |
| CONCURSANTE                    |                      |                                                  |               |               |               | S.T.C.      |  |
| IMPORTE DE LA                  | ORIGINAL SIN IVA     |                                                  |               |               |               |             |  |
| PROPUESTA                      | CORREGIDA SIN IVA    |                                                  |               |               |               |             |  |
| PORCENTAJE RESPECTO AL S.T.C.  |                      |                                                  |               |               |               | 100 %       |  |
| FECHA DE TERMINACION PROPUESTA |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| CALENDARIO DE TRABAJO          |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| RELACION DE EQUIPO             |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| % COSTO INDIRECTO INTEGRADO    |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| COSTO INDIRECTO                |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| COSTO FINANCIAMIENTO           |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| COSTO UTILIDAD                 |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| DATOS BASICOS                  | MONTO ANALIZADO C.P. |                                                  |               |               |               |             |  |
| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  |                      |                                                  |               |               |               | 100 %       |  |
| REVISOR                        | Vo. Bo.              | OBSERVACIONES                                    | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |             |  |
| PARTICIPANTES                  |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| CONTRATISTAS:                  |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| PROPUESTAS RECIBIDAS:          |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| PROPUESTAS DESECHADAS          |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| SE DISCULPARON                 |                      |                                                  |               |               |               |             |  |
| NO SE PRESENTARON              |                      |                                                  |               |               |               |             |  |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE:                  | S/N                                                                                                        |
| OBJETIVO:               | Evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados para los participantes en las licitaciones. |
| FORMULACION A CARGO DE: | Unidad de Obra Pública.                                                                                    |
| MEDIO DE ELABORACION:   | Mecanográfica y manual.                                                                                    |
| No. DE EJEMPLARES:      | Original y copia                                                                                           |
| DISTRIBUCION:           | Original.- Expediente de la licitación<br>Copia.- Archivo.                                                 |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS

| No | CONCEPTO        | SE DEBE ANOTAR                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OBRA PUBLICA    | La obra pública o los trabajos relacionados que son sujetos de la licitación                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | LICITACION      | La clave y número de la licitación.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | FECHA           | El día, mes y año en que se elabore la forma.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | DATO BASICO     | El nombre del dato básico a considerar en cada formato (mano de obra, materiales, equipo).                                                                                                                                                                                            |
| 5  | NOMBRE          | Cada uno de los conceptos que integran el dato básico.                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | UNIDAD          | La unidad de medida de cada concepto.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | PRECIO UNITARIO | El precio unitario correspondiente a cada concepto propuesto para cada contratista participante en la licitación, únicamente para efecto de verificar su consideración en la propuesta técnica.<br><br>La última columna será destinada para el S.T.C., y anotando la leyenda "100%". |



CIUDAD DE MÉXICO


## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

01

VI

98

DE 73

### RESOLUCION

La Dirección de Operación, a través del

de acuerdo con las bases y criterios definidos a través de la convocatoria correspondiente a la  
licitación No. \_\_\_\_\_, para la  
Obra: \_\_\_\_\_

\_ y habiendo comparado, en igualdad de circunstancias, cada una de las posturas técnicas  
debidamente integradas, emite la presente:

## RESOLUCION

Las posturas que fueron aceptadas y que podrán continuar en el proceso de licitación son las  
siguientes:

Asimismo, las propuestas que resultaron desechadas, tanto como las causas que lo originaron,  
son las siguientes:

**Empresa:**

**Causas:**

Se extiende la presente en la Ciudad de México, D.F. a los \_\_\_\_\_,  
por los Servidores Públicos firmantes, para los efectos legales procedentes.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

DIRECCION DE OPERACION

**SISTEMA:**

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

01

VI

98

DE

73

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA RESOLUCION

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Hacer constar el resultado de la evaluación de las  
propuestas técnicas de las licitaciones.

FORMULACION A CARGO DE:

Unidad de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfica.

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Expediente de la licitación  
Copia.- Archivo.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA RESOLUCION

| No             | CONCEPTO           | SE DEBE ANOTAR                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | A TRAVES DE        | El nombre del área responsable de la evaluación de las propuestas técnicas.                                                                                                                                           |
| 2              | LICITACION         | La clave de la licitación correspondiente.                                                                                                                                                                            |
| 3              | PARA LA OBRA       | El nombre de la obra pública sujeta de la licitación.                                                                                                                                                                 |
| 4              | SON LAS SIGUIENTES | El nombre o razón social de cada uno de los contratistas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas.                                                                                                                  |
| 5              | EMPRESAS           | El nombre o razón social de cada uno de los contratistas cuyas propuestas técnicas fueron desechadas.                                                                                                                 |
| 6              | CAUSAS             | Los motivos de la descalificación de los contratistas del proceso de la licitación.                                                                                                                                   |
| AUTORIZACIONES |                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7              |                    | Nombre completo y firma del Gerente de Líneas o titular del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, según corresponda.                                                                                   |
| 8              |                    | En su caso, nombre completo y firma del Subgerente de Línea correspondiente.                                                                                                                                          |
| 9              |                    | Nombre completo y firma del titular del Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales o del Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos correspondiente. |



CIUDAD DE MÉXICO


## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

01

VI

98

DE 73

### DICTAMEN

La Dirección de Operación, a través del

de acuerdo con las bases y criterios definidos a través de la convocatoria correspondiente a la  
licitación No. \_\_\_\_\_, para la  
Obra: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ y habiendo comparado, en igualdad de circunstancias, cada una de las posturas debidamente  
integradas, emite el presente:

## ***DICTAMEN***

La propuestas que mejor satisface los requisitos mínimos legales, técnicos, económicos y de  
plazo, es la de la Empresa: \_\_\_\_\_, cuya oferta es de un  
monto de \$ \_\_\_\_\_ (sin incluir I.V.A.), por lo que  
se le asigna el Contrato correspondiente.

Asimismo, se enlistan a continuación las Empresas Postoras en orden creciente de oferta,  
cuyas propuestas no fueron elegidas:

Finalmente se informa que se desechó la siguiente propuesta por la causa que se señala:

Se extiende la presente en la Ciudad de México, D.F. a los \_\_\_\_\_,  
por los Servidores Públicos firmantes, para los efectos legales procedentes.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### DICTAMEN

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Hacer constar la evaluación de las propuestas presentadas por los contratistas participantes en licitaciones para la adjudicación de contratos de obra.

FORMULACION A CARGO DE:

Unidad de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfica.

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Expediente de la licitación  
Copia.- Archivo.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### DICTAMEN


| No | CONCEPTO            | SE DEBE ANOTAR                                                                                        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A TRAVES DE         | El nombre del área responsable de la evaluación de las propuestas.                                    |
| 2  | LICITACION          | La clave de la licitación correspondiente.                                                            |
| 3  | PARA LA OBRA        | El nombre de la obra pública sujeta de la licitación.                                                 |
| 4  | ES DE LA EMPRESA    | El nombre o razón social de la contratista a la que se le asigna el contrato motivo de la licitación. |
| 5  | MONTO               | Con número y letra, el importe del contrato asignado.                                                 |
| 6  | NO FUERON ELEGIDAS  | El nombre o razón social de cada uno de los contratistas cuyas propuestas fueron rechazadas.          |
| 7  | CAUSA QUE SE SEÑALA | Los motivos de la descalificación de los contratistas del proceso de la licitación.                   |
| 8  | A LOS               | La fecha en que se emite el Dictamen correspondiente.                                                 |

### AUTORIZACIONES

|   |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Nombre completo y firma del Gerente de Líneas o titular del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, según corresponda.                                                                                   |
| 8 | En su caso, nombre completo y firma del Subgerente de Línea correspondiente.                                                                                                                                          |
| 9 | Nombre completo y firma del titular del Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales o del Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos correspondiente. |



## OPERACION Y MANTENIMIENTO



DE 73

## AÑO

|           |   |   |  |                                     |   |   |  |                        |   |   |  |                          |   |   |  |                             |  |
|-----------|---|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|---|---|--|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
|           |   |   |  | SUBGERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL |   |   |  | DIRECCION DE OPERACION |   |   |  | GERENCIA DE CONTABILIDAD |   |   |  | ESTA RELACION \$            |  |
| D         | M | A |  | D                                   | M | A |  | D                      | M | A |  | D                        | M | A |  | ACUMULADO HASTA REL. No. \$ |  |
| RECEPCION |   |   |  | RECEPCION                           |   |   |  | RECEPCION              |   |   |  | RECEPCION                |   |   |  | TOTAL ACUMULADO \$          |  |
| TITULAR   |   |   |  | TITULAR                             |   |   |  | TITULAR                |   |   |  | TITULAR                  |   |   |  |                             |  |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 47

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### "REGISTRO Y CONTROL DE AUTORIZACIONES"

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Efectuar el registro y control de autorizaciones de los contratos de trabajo relativos a la obra pública celebrados con terceros que se lleven a cabo en las diferentes áreas del Sistema de Transporte Colectivo.

FORMULACION A CARGO DE:

Unidad de Obra Pública

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfica

No. DE EJEMPLARES:

Original y 3 copias.

DISTRIBUCION:

Original.- Unidad de Obra Pública.  
Copia N° 1.- Gerencia de Presupuesto  
Copia N° 2.- Dirección de Operación  
Copia N° 3.- Gerencia de Contabilidad.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 48

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REGISTRO Y CONTROL DE AUTORIZACIONES"

| No | CONCEPTO                                                        | SE DEBE ANOTAR                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | RELACION                                                        | El número progresivo de la relación.                                                                                                                                        |
| 2  | PROGRAMA                                                        | Las siglas del programa según el presupuesto del área.                                                                                                                      |
| 3  | FECHA                                                           | Día, mes y año de elaboración de la forma                                                                                                                                   |
| 4  | CONTRATO                                                        | Las siglas del programa antecedidas de las iniciales DO; el número progresivo de la actividad y las dos últimas cifras del año para el que se programó.                     |
| 5  | AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL                                       | Clave presupuestal asignada a la partida presupuestal.                                                                                                                      |
| 6  | CONTRATISTA                                                     | El nombre o razón social de la persona o sociedad que efectuará la obra o trabajo.                                                                                          |
| 7  | OBRAS                                                           | Descripción de la actividad y el lugar donde se efectuará la obra o trabajo.                                                                                                |
| 8  | IMPORTE                                                         | La cantidad con número del importe, incluyendo IVA, que se va a pagar por el servicio a efectuar                                                                            |
| 9  | UNIDAD DE OBRA PÚBLICA.<br>DMA RECEPCION TITULAR                | El día, mes, año y firma de recepción de la relación de control de autorizaciones en la Unidad de Obra Pública, así como el nombre y firma del Titular del área y la fecha. |
| 10 | SUBGERENCIA DE CONTROL<br>PRESUPUESTAL<br>DMA RECEPCION TITULAR | El día, mes, año y firma de recepción, así como el nombre y firma del Titular del área y la fecha.                                                                          |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 49

01

VI

98

DE 73

| No | CONCEPTO                                          | SE DEBE ANOTAR                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | DIRECCION DE OPERACION<br>DMA RECEPCION TITULAR   | El día, mes, año y firma del Titular del área y la fecha.                                                       |
| 12 | GERENCIA DE CONTABILIDAD<br>DMA RECEPCION TITULAR | El día, mes, año y firma de recepción, así como el nombre y firma del titular del área y la fecha.              |
| 13 | ESTA RELACION                                     | La cantidad que resulta de sumar los importes descritos en la relación.                                         |
| 14 | ACUMULADO HASTA<br>RELACION N° _____              | La cantidad total acumulada en la relación anterior si el control de autorizaciones consta de dos o más formas. |
| 15 | TOTAL ACUMULADO                                   | La cantidad que resulta de sumar esta relación más lo acumulado hasta relación N° _____                         |



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 50

01

VI

98

DE

73

## REVISION DE PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PROPIO Y/O RENTADO

Dirección de Operación

Licitación

☐

Pública

☐

Simplificada No.

México, D.F., a

Para : \_\_\_\_\_

En relación a la Licitación arriba indicada, correspondiente a la obra:

\_\_\_\_\_

y a efecto de contar con su análisis en cuanto al cumplimiento de los requisitos básicos, anexo al presente me permito hacer llegar a usted \_\_\_\_\_ legajos de fotocopias de los documentos que ha continuación se enlistan (favor de cruzar el casillero respectivo).

Compañía: \_\_\_\_\_

Cumple:

8 Sí ☐ Programa calendarizado de ejecución de los trabajos.

8 No ☐ \_\_\_\_\_

8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero.

8 No ☐ \_\_\_\_\_

8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.

8 No ☐ \_\_\_\_\_

8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción.

8 No ☐ \_\_\_\_\_

8 Sí ☐ Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.

8 No ☐ \_\_\_\_\_

8 Sí ☐ Relación de maquinaria y equipo de construcción propio y/o rentado, así como ubicación física y vida útil.

8 No ☐ \_\_\_\_\_



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 51

01

VI

98

DE 73

**Licitación No.**

**Compañía:** \_\_\_\_\_

**Cumple:**

- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de ejecución de los trabajos.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Relación de maquinaria y equipo de construcción propio y/o rentado, así como ubicación física y vida útil.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_

**Compañía:** \_\_\_\_\_

**Cumple:**

- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de ejecución de los trabajos.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_
- 8 Sí ☐ Relación de maquinaria y equipo de construcción propio y/o rentado, así como ubicación física y vida útil.
- 8 No ☐ \_\_\_\_\_

Que forman parte de la propuesta técnica recibida.

Esta sub Jefatura agradecerá a usted sirva devolver este formato debidamente requisitado a más tardar el próximo \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ antes de las \_\_\_\_ horas, en virtud de que esta información se tendrá que integrar para dar una resolución a la Licitación.

Nota: Si algún documento no cumpliera, indicar las observaciones de cada uno de los programas.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 52

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### RESULTADOS DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar los resultados del análisis de cumplimiento de los requisitos básicos de los documentos que forman parte de la propuesta técnica recibida.

FORMULACION A CARGO DE: Unidad de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Subjefatura de Costos de Obra Pública.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 53

01

VI

98

DE 73


## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### RESULTADOS DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

| No | CONCEPTO                        | SE DEBE ANOTAR                                                                                                                                |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MEXICO D.F.                     | Día, mes y año en el que se elabore la forma.                                                                                                 |
| 2  | LICITACION PUBLICA SIMPLIFICADA | Marcar con una "X" el recuadro de la licitación de la que se trate.                                                                           |
| 3  | No.                             | La clave y número de la licitación que corresponda.                                                                                           |
| 4  | PARA:                           | El nombre del área solicitante de los trabajos relacionados que son sujetos de la licitación.                                                 |
| 5  | OBRA:                           | El nombre de la obra pública o los trabajos que son sujetos de la licitación.                                                                 |
| 6  | A USTED                         | El número de legajos de fotocopias de los documentos que se envían.                                                                           |
| 7  | COMPAÑÍA:                       | El nombre de cada contratista participante en la licitación.                                                                                  |
| 8  | CUMPLE SI NO                    | Marcar con una "X" el recuadro correspondiente al cumplimiento o no de los documentos básicos solicitados.                                    |
| 9  |                                 | En caso de haber marcado el recuadro correspondiente a "No" en el punto anterior indicar las razones por las cuales fue marcada dicha opción. |
| 10 | PROXIMO__DE__ANTES DE LAS__     | Día, mes y hora en la que se deberá devolver el formato a la Subjefatura de Costos de Obra Pública.                                           |



## OPERACION Y MANTENIMIENTO



DE 73

**IMPORTE TOTAL DE  
LA PROPOSICION SIN  
I.V.A.**


[illegible]

**UNIDAD ADMVA.**

DIRECCION DE OPERACION

**SISTEMA:**

## OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

V I G E N C I A

FECHA

PAG. 55

01

VI

98

DE 73

## CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTOS

**DIRECCION DE OPERACION**  
PROPUESTA ECONOMICA  
CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTOS

LICITACION PUBLICA

No.

FECHA

OBRA

HORA

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 56

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTOS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar los documentos que las contratistas presentan en la licitación correspondiente a las propuestas técnicas y económica, según corresponda.

FORMULACION A CARGO DE: Unidad de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Expediente de la licitación.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 57

01

VI

98

DE 73


## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTOS

| No | CONCEPTO                | SE DEBE ANOTAR                                                                                     |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | FECHA                   | El día, mes, y año en que se elabore la forma.                                                     |
| 2  | HORA                    | Hora exacta en la que se lleva a cabo la apertura de los sobres.                                   |
| 3  | OBRA                    | La obra pública o los trabajos relacionados que son sujetos a la licitación.                       |
| 4  | COMPAÑIAS PARTICIPANTES | El nombre de cada contratista participante en la licitación.                                       |
| 5  | DOCUMENTOS              | Marcar con una "X" el recuadro correspondiente al cumplimiento o no de los requisitos solicitados. |
| 6  | OBSERVACIONES           | Los comentarios o aclaraciones que se consideren convenientes.                                     |



## OPERACION Y MANTENIMIENTO



DE 73

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 59

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### CUADRO DE PROCESO DE CONCURSO

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE:                  | S/N                                                                        |
| OBJETIVO:               | Registrar la participación de las contratistas en las etapas del concurso. |
| FORMULACION A CARGO DE: | Unidad de Obra Pública.                                                    |
| MEDIO DE ELABORACION:   | Manual                                                                     |
| No. DE EJEMPLARES:      | Original                                                                   |
| DISTRIBUCION:           | Expediente de la licitación.                                               |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 60

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### CUADRO DE PROCESO DE CONCURSO

| No | CONCEPTO                | SE DEBE ANOTAR                                                                                      |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OBRA                    | La obra pública o los trabajos relacionados que son sujetos a la licitación.                        |
| 2  | COMPAÑIAS PARTICIPANTES | El nombre de cada contratista participante en la licitación.                                        |
| 3  | ETAPAS                  | Marcar con una "X" el recuadro correspondiente a la participación de la contratista en el concurso. |
| 4  | OBSERVACIONES           | Los comentarios o aclaraciones que se consideren convenientes.                                      |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 61

01

VI

98

DE 73

## MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, \_\_\_\_\_, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL S.T.C." Y POR LA OTRA \_\_\_\_\_, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA POR SU \_\_\_\_\_: AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### DECLARACIONES

#### I. "EL S.T.C." DELCARA QUE:

- I.1 Es un organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril del mismo año, con personalidad jurídica y patrimonio propios, modificado por Decreto Presidencial de fecha 15 de junio de 1992 y publicado el 17 de junio de ese mismo año, cuyo objetivo será la construcción, operación y explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial para el transporte colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de la ciudad de México, que comprende áreas conurbadas del Distrito Federal y del Estado de México. Tendrá también dicho organismo por objeto la operación y explotación del servicio público de transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y cuyo recorrido complemente el del tren subterráneo, con Registro Federal de Causantes STC-670419-QYL
- I.2 El C. \_\_\_\_\_, acredita la personalidad que ostenta con el testimonio de la escritura pública número 4231, libro 95, folio 89769, de fecha 11 de enero de 1995, otorgado ante la fe del Notario Público número 144 del Distrito Federal, Lic. Alfredo G. Miranda solano.
- I.3 Señala como domicilio el número 67 de la calle de Delicias, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06070, México, Distrito Federal.
- I.4 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la \_\_\_\_\_ autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, en el oficio de autorización No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_.
- I.5 La adjudicación del presente contrato se realizó a través de \_\_\_\_\_

#### II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- II.1 Bajo protesta de decir verdad, el Contratista \_\_\_\_\_, que represento, no forma parte ni como accionista, ni como trabajador, persona alguna que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o se encuentre inhabilitado para desempeñarlo, de conformidad con lo presupuestado en el artículo 47, fracción XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En caso de resultar falsa la manifestación antes mencionada o que durante la vigencia del contrato se incurra en tal hipótesis, éste será nulo, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 41 de la Ley de adquisiciones y Obras Públicas, en relación con el artículo 2225 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 62

01

VI

98

DE 73

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

**II.2** En el caso de sociedades:

**“EL CONTRATISTA”** declara que es una Sociedad legalmente constituida y acredita su existencia, con la escritura pública No. \_\_\_\_\_, volumen \_\_\_\_\_, libro \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, otorgada ante la fe del Notario Público No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ ciudad \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, inscrita en el Registro Público con No. \_\_\_\_\_, partida \_\_\_\_\_, volumen \_\_\_\_\_, libro \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_ El C. \_\_\_\_\_ acredita la personalidad de \_\_\_\_\_ con testimonio de la escritura No. \_\_\_\_\_, volumen \_\_\_\_\_, libro \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, otorgada ante la fe del Notario Público No. \_\_\_\_\_ de la Ciudad de \_\_\_\_\_, Lic. \_\_\_\_\_; y bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocado, modificado ni limitado el cargo con el que comparece.

**II.3** Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

**II.4** Que tiene establecido su domicilio en las calles de \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_, Colonia \_\_\_\_\_ Delegación \_\_\_\_\_, C.P. \_\_\_\_\_ mismo que señala para todos los fines y efectos legales del contrato. Con R.F.C. \_\_\_\_\_ y No. de Registro de C.M.I.C. \_\_\_\_\_

**II.5** Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de adquisiciones y Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las normas de construcción vigentes y especificaciones de la obra objeto de este contrato, el contenido de los anexos relativos **ANEXO I PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA Y ANEXO II (INSTRUCTIVO)**, que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

**II.6** Que ha inspeccionado el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

**III LAS PARTES DECLARAN:**

**UNICO.-** Que se obligan en todos y cada uno de los términos de este contrato, así como al contenido de la sección correspondiente de las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las que se tienen aquí por reproducidas, formando parte integrante de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

## CLAUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** “EL S.T.C” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de una obra consistente en:

\_\_\_\_\_



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 63

01

VI

98

DE 73

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la Declaración II.5 de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-** El monto del presente contrato es de: \$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ), más el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., que es de \$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ), que dan como monto total del contrato, la cantidad de: \$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ).

Esta cantidad sólo podrá ser rebasada previo Convenio Adicional entre las partes, por lo que si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho de reclamar alguno por ello.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** **"EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_ y a concluir las a más tardar el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_ de conformidad con el programa de obra.

**CUARTA.- DISPOSICIONES DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-** **"EL S.T.C."** se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieren para su realización.

**QUINTA.- ANTICIPOS-** **"EL S.T.C."** otorgará un anticipo por la cantidad de: \$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ), incluyendo I.V.A. éste anticipo se otorga de común acuerdo con **"EL CONTRATISTA"** y se desglosa de esta forma: 10% del importe de este contrato para inicio de obra, que es la cantidad de \$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ), más el 20% para la compra de materiales, por la cantidad de: \$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) y **"EL CONTRATISTA"** se obliga a utilizarlos en dichos trabajos.

**"EL S.T.C."** entregará a **"EL CONTRATISTA"** el monto del anticipo dentro de los 15(quince) días naturales siguientes a la presentación de una fianza por el importe del mismo, para garantizar su debida inversión y la póliza respectiva deberá contener las declaraciones señaladas en los incisos d) y e) de la Cláusula SÉPTIMA. Asimismo, dicho anticipo se amortizará deduciendo de cada estimación el 30% del importe de la misma, hasta la completa liquidación de dicho anticipo.

En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de la contratante.

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.-** Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán PERIODOS DE TREINTA DÍAS, las que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** a la residencia de supervisión dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de las mismas, que serán pagadas por la Gerencia de Recursos Financieros de **"EL S.T.C."**, en la calle de Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06070, México, D.F.

Cuando las estimaciones no sean presentadas por **"EL CONTRATISTA"** en el término anteriormente señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que **"EL S.T.C."**, inicie su trámite de pago. Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, ya que **"EL S.T.C."** se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 64

01

VI

98

DE 73

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

Cuando “EL CONTRATISTA” reciba pagos en exceso, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórrogas para el pago del Crédito Fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Organismo.

**SEPTIMA.- GARANTÍA.- “EL CONTRATISTA”**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones, mismas que se consideran indivisibles derivadas de este contrato, deberá presentar ante “EL S.T.C.”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicación, una póliza de fianza por valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de “EL S.T.C.”

Cuando la ejecución de los trabajos, conforme a lo estipulado en el contrato, rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetará en lo conducente a los términos señalados en esta regla: en el concepto de que para el primer ejercicio la fianza deberá garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza deberá ajustarse en relación al monto real ejercido e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversión autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere, artículo 26, fracción I.R.L.O.P.

El incremento de la garantía en su caso, deberá acreditarse por “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL S.T.C.” le comunique los términos de ella autorización presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

La fianza mencionada estará vigente hasta un año después de la recepción total de los trabajos, para responder tanto de los defectos de construcción como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor del “EL S.T.C.”, derivada del contrato. En este último caso, la fianza continuará vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades. La póliza en que sea expedida la fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que le otorgue:

- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato y para garantizar la ejecución total de los trabajos y obras objeto del mismo.
- Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera.
- Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de “EL S.T.C.”.
- Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL S.T.C.”.
- Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL S.T.C.” podrá declarar la rescisión administrativa del contrato.
- En el evento de que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento ampliatorio en los términos del artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
- Que la Institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93, 93 bis, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, renunciando al derecho que les otorga el artículo 119 de la Ley señalada.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 65

01

VI

98

DE 73

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

**OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS.-** Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia (Artículo 67 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas).

La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que aparece detallado en el Anexo DOS del presente contrato (Art. 50 del R.L.O.P. y 68 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas).

**NOVENA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.-** “EL S.T.C.” a través de los representantes que para tal efecto designe en su oportunidad por escrito, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estimen pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL S.T.C.”

Es facultad de “EL S.T.C.” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición o de fabricación.

**DECIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme a las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato y a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose “EL S.T.C.” el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

“EL S.T.C.”, verificará que los trabajos estén debidamente concluidos el día \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ y una vez que haya constatado la terminación de los trabajos, procederá a su recepción dentro de los treinta días hábiles siguientes.

“EL S.T.C.” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

**DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.-** “EL CONTRATISTA”- se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, a un representante permanente que obrará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL S.T.C.” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

**DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.-** “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL S.T.C.” en relación con los trabajos del contrato y a resarcir a “EL S.T.C.” de cualquier daño o perjuicio que se le causare por tal motivo.

**DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.** “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra, motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo Uno de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “EL S.T.C.”, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL S.T.C.” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 66

01

VI

98

DE 73

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

Igualmente, se obliga **"EL CONTRATISTA"** a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de **"EL S.T.C."** en los términos de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

**DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.-** **"EL S.T.C."** tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato, se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual **"EL S.T.C."** comparará periódicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de dicha comparación, el avance de las obras es menor de lo que debió realizarse. **"EL S.T.C."** procederá a:

- a) Retener en total una tasa mensual del 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplicado por el número de días transcurridos desde la fecha del retraso hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención y en su caso la devolución, siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** se regularice en su programa de obra en el mes siguiente que corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa de obra estipulado en el contrato, procede hacer alguna retención, ésta se convierte en sanción y su importe se aplicará a favor de **"EL S.T.C."** como pena convencional, por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

- b) Aplicar, para el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual a una tasa mensual del 3% (tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de **"EL CONTRATISTA"** mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de **"EL S.T.C."**

Si como resultado de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato resultare afectada la operación de **"EL S.T.C."**, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedora a una sanción económica cuyo monto se calculará de acuerdo al grado de afectación ocasionado para **"EL S.T.C."** sin perjuicio del costo que resulte de la reparación material del desperfecto, mismo que será por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

En la determinación de las sanciones por demoras en el programa, se considerarán aquellas causas que sean imputables a **"EL CONTRATISTA"** excluyéndose las que hayan sido motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquiera otra causa que a juicio de **"EL S.T.C."** no sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, **"EL S.T.C."** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

En caso de que **"EL S.T.C."** opte por la rescisión del contrato en términos de las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, aplicará a **"EL CONTRATISTA"** una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podrá ser, a juicio de **"EL S.T.C."**, hasta por el monto de las garantías otorgadas.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan **"EL CONTRATISTA"**, se harán efectivas con cargo a las cantidades que le han sido retenidas en los términos de dichas reglas, aplicando si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en las propias reglas.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 67

01

VI

98

DE 73

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

- c) En caso de que la Entidad proceda a rescindir el contrato, procederá a hacer efectivas las fianzas y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente.

**DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** “EL S.T.C.” podrá suspender temporalmente en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

**DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** “EL S.T.C.” podrá en cualquier momento rescindir unilateral y administrativamente este contrato, sin necesidad de acudir a los tribunales judiciales, por causa de interés general o por las causas señaladas en el siguiente párrafo:

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “**EL CONTRATISTA**” que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión, además de que se le aplique a “**EL CONTRATISTA**” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

**DÉCIMA SÉPTIMA.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integren, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.-** “EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones:

- a) El 0.2% (punto dos por ciento) de cada estimación, para que sea enterado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, dependiente de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, por concepto del personal del ramo.
- b) El 2.0% (dos punto cero por ciento) del importe de cada estimación por concepto de derecho por los servicios de auditoría que presenta la Contraloría General del Distrito Federal.
- c) El 1.5% (uno punto cinco por ciento) del importe de cada estimación, para cubrir los gastos de supervisión de “EL S.T.C.”.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 68

01

VI

98

DE 73

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

**DÉCIMA NOVENA.-** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para su ejecución forzada y para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, por lo tanto **“EL CONTRATISTA”** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de México, Distrito Federal, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 199..., en original y cinco copias.

**POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**

**POR “EL CONTRATISTA”**

**C.**  
**DIRECTOR GENERAL**

**C.**  
**SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO**

**C.**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y  
MANTENIMIENTO DE ÁREAS GENERALES**



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 69

01

VI

98

DE 73

## INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS SEGÚN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato.

El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la Materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra.

El procedimiento que se aplicará para determinar el factor de ajuste de estos por la Dependencia con los descritos en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y son:

1. Revisar cada uno de los precios de cada contrato o
2. Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo faltantes por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato.

El ajuste se sujetará a lo siguiente:

- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al programa vigente.
- Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.
- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los relativos, o el índice que determina la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, cuando los relativos que requiera el contratista o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, las Dependencias y Entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen utilizando los lineamientos y metodología que expida la Secretaría.
- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta en función del indicador económico utilizado, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 70

01

VI

98

DE 73

Para que la **ENTIDAD** proceda al estudio de ajuste de costos el **CONTRATISTA** deberá presentar los siguientes documentos

1. Solicitud por escrito al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública mencionando los datos de la licitación y el número de Contrato correspondiente, lo que deberá acompañar con la siguiente documentación necesaria.
  - a) Programa vigente o de contrato debidamente avalado por el área de Supervisión indicando cantidades de obra faltantes por ejecutar a partir de la fecha en que se solicita el ajuste de costos.
  - b) Presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar
  - c) De cada uno de los insumos que intervienen en los análisis de precios unitarios de los conceptos de obra del presupuesto anterior, el porcentaje de decremento o incremento aplicando los índices relativos que la Secretaría de Contraloría y desarrollo Administrativo publica para tal efecto (mano de obra, materiales, equipo, herramienta o intereses de captación bancaria).
  - d) Matrices de precios unitarios ajustados con los insumos ajustados en el punto anterior
  - e) Por último presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar ajustado con los precios en el punto anterior, con cuyo importe se determinará el porcentaje a aplicar en las estimaciones correspondientes, al dividir el importe del presupuesto del punto 2.
  - f) – Soportes adicionales - Indices relativos (SECODAM) – Tasa de Interés (Indicador económico utilizado)

Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos anteriores, no será recibida la solicitud de acuerdo a la cláusula de ajuste de costos.

- Cuando la obra contratada se realice en más de un ejercicio presupuestal, la fianza de cumplimiento que la contratista otorgue a la ENTIDAD (Dependencia), se sustituirá por otra equivalente al diez por ciento del importe de los trabajos aún no ejecutados. Incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere.



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 71

01

VI

98

DE

73

## RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- **HOJA DE REFERENCIA DE DATOS IMPORTANTES**
- **DOCUMENTOS QUE DEBEN COLOCARSE DENTRO DE LOS SOBRES DE LAS PROPOSICIONES.**

### PROPUESTA TECNICA

- **DOCUMENTO 1A.** CARTA PODER SIMPLE CON EL QUE EL POSTOR ACREDITA LA PERSONALIDAD DE SU REPRESENTANTE O EN SU CASO, CARTA CON LA QUE EL POSTOR MANIFIESTA SU PERSONALIDAD DENTRO DE LA COMPAÑÍA.
- **DOCUMENTO 2A.** ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA O ACTA DE NACIMIENTO, EN SU CASO.
- **DOCUMENTO 3A.** REGISTRO COMPLETO Y ACTUALIZADO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, O EN SU CASO, EL DE LA CAMARA A QUE CORRESPONDA, EN CASO DE ESTAR INSCRITO O AFILIADO.
- **DOCUMENTO 4A.** PLIEGO DE REQUISITOS.
- **DOCUMENTO 5A.** DATOS BASICOS
  - a) De materiales puestos en obra.
  - b) De Maquinaria y equipo de construcción puestos en obra, con su respectivo análisis del costo horario.
  - c) De mano de obra, con su respectivo cálculo del factor de salario real.
- **DOCUMENTO 6A.** PROGRAMAS:
  - a) Calendarizado de ejecución de los trabajos.
  - b) Calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.
  - c) Calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 72

01

VI

98

DE 73

- d) Calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
- e) Calendarizado de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.
- **DOCUMENTO 7A.** RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PROPIO Y/O RENTADO, ASI COMO UBICACIÓN FISICA Y VIDA UTIL.
- **DOCUMENTO 8A.** RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR Y DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES.
- **DOCUMENTO 9A.** MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
- **DOCUMENTO 10A.** MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE CELEBREN, Y EN SU CASO CIRCULARES ACLARATORIAS.

## PROPUESTA ECONOMICA

- **DOCUMENTO 1B.** DATOS Y ANALISIS BASICOS.
  - a) Relación de conceptos de los que deberá presentar análisis detallado de precios unitarios.
  - b) Instructivo para el análisis detallado de precios unitarios.
  - c) Desglose del cargo indirecto y análisis para la determinación del cargo indirecto.
  - d) Análisis detallado del cargo por financiamiento.
  - e) Análisis del costo horario de la maquinaria y equipo.
  - f) Análisis detallado de precios unitarios.
  - g) Representación de la explosión de insumos.
- **DOCUMENTO 2B.** PROGRAMAS.
  - a) De montos mensuales de ejecución de los trabajos.
  - b) De montos mensuales de utilización del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.
  - c) De montos mensuales de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
  - d) De montos mensuales de utilización de la maquinaria y equipo de construcción.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE  
LICITACION PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 73

01

VI

98

DE 73

e) De montos mensuales de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.

- **DOCUMENTO 3B.** CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA (DOCUMENTO DISPONIBLE UNICAMENTE EN LA CONVOCANTE). NOTA: La Compañía contratista deberá proteger el importe total de su propuesta con cinta adhesiva transparente.
- **DOCUMENTO 4B.** ESCRITO PROPOSICION. NOTA: La Compañía contratista deberá proteger el importe total de su propuesta con cinta adhesiva transparente.
- **DOCUMENTO 5B.** RESUMEN POR PARTIDAS.
- **DOCUMENTO 6B.** GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICION. NOTA: El cheque cruzado o la fianza deberá presentarse estricta y exclusivamente a favor del Sistema de Transporte Colectivo.
