

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

194

FECHA

9 - I - 98

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para la Planeación, Programación y Presupuestación de Obra Pública

OBJETIVO : Planear, programar y presupuestar anualmente los trabajos relacionados con obra pública que requiera el organismo, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y considerando la atención de aspectos prioritarios para la operación del Sistema de Transporte Colectivo, observando disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo.
Total de páginas 19.

DIRECCION (ES)**RESPONSABLE (S)**

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Requís Bustos

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en E. Mario J. Zepeda Martínez


Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 9 - I - 98
ING. PEDRO LUIS BENITEZ ESPARZA

OBSERVACIONES: El presente procedimiento cancela y sustituye al del mismo nombre y número de folio de fecha I-VI-94.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

19

XII

97

DE: 14

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA			PAG.	2
19	XII	97	DE:	14

OBJETIVO

Planear, programar y presupuestar anualmente los trabajos relacionados con obra pública que requiera el organismo, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y considerando la atención de aspectos prioritarios para la operación del Sistema de Transporte Colectivo, observando disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

19

XII

97

DE: 14

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la planeación, programación y presupuestación de obra pública
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
 - Ley.- La Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
 - Obra Pública.- La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles; los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la dirección o supervisión de la ejecución de las obras; los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones cuando el costo de éstas sea superior al de los bienes muebles que deban adquirirse; los proyectos integrales, que comprenderán desde el diseño de la obra hasta su terminación total, y todos aquellos de naturaleza análoga.
 - Área Solicitante.- Las unidades orgánicas de nivel Gerencia que solicitan trabajos relacionados con obra pública.
 - **DMAR**.- Las siglas mediante las cuales se identificarán a los Departamentos de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, adscritos a las Gerencias de Línea.
 - **DEPYMAG**.- El Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales adscrito a la Dirección de Operación.
- El DEPYMAG será el responsable de captar los requerimientos de obra pública por parte de las áreas encargadas de las siguientes instalaciones

◦ Conjunto Delicias	◦ Conjunto Zaragoza
◦ CENDI	◦ Deportivo Metro
◦ Talleres de Mantenimiento de Material Rodante	◦ Edificios ubicados sobre las estaciones.

- Las Gerencias de Línea, a través de los Departamentos de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos que corresponda, captarán los requerimientos de obra pública de las áreas responsables de las siguientes instalaciones:



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

19

XII

97

DE: 14

◦ Estaciones

◦ Interestaciones

◦ Subestaciones de Rectificación

- La Dirección de Operación integrará los requerimientos de obra pública de todas las áreas del Organismo, a efecto de considerarlos en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de los Capítulos 3000 y 6000, y lo hará del conocimiento de la Gerencia de Presupuesto, en la forma y términos establecidos en el procedimiento para la integración presupuestal.
- Una vez que sea determinada la disponibilidad presupuestal por la Secretaría de Finanzas del D.F., la Dirección de Operación ajustará, en coordinación con las demás gerencias del Organismo, los requerimientos de obra, de acuerdo al techo financiero asignado, integrando el Programa de Inversión de los Capítulos 3000 y 6000.
- La Dirección de Operación someterá para su aprobación, el Programa de Inversión al Comité de Obras del Sistema de Transporte Colectivo.
- Los Departamentos de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, de las Gerencias de Línea, y el de Licitación y Costos de Obra Pública, serán responsables de determinar la modalidad de contratación de la obra pública, atendiendo los siguientes aspectos:
 - El monto de cada requerimiento de obra.
 - Los rangos para adjudicación establecidos en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio de que se trate.
- En la planeación de obra pública, el Organismo deberá ajustarse a los objetivos, metas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales y a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal.
- El Sistema de Transporte Colectivo elaborará su programa de obra y su respectivo presupuesto considerando las siguientes acciones:

DE MANERA GENERAL

- Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

19

XII

97

DE: 14

- Los resultados previsibles.
- La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de la obra.
- La supervisión de la ejecución de los trabajos, misma que podrá ser realizada directamente por el Organismo, o a través de terceros.
- Los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo.
- Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de la obra.

PREVIAMENTE

- Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecución, incluyendo las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquellas en servicio;
- Los requerimientos de áreas y predios;
- La coordinación con otras dependencias internas y externas;
- Los efectos y consecuencias ambientales;
- Los recursos humanos, materiales y financieros a utilizar, así como su calendarización física y financiera;
- Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica y ecológica en la realización de la obra.

DURANTE

- La modalidad mediante la que se contratará la obra (Adjudicación Directa, Adjudicación mediante Licitación por Invitación Restringida o Adjudicación mediante Licitación Pública);



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

19

XII

97

DE: 14

- La integración del Catálogo de Especificaciones y de Conceptos de Trabajo;

POSTERIORMENTE

- Las acciones para poner en servicio la obra.
- Los recursos para su operación.
- La conservación y el mantenimiento.

– La Dirección de Operación considerará los siguientes tipos de obra a programar:

- | | |
|--|---|
| • Por Contrato | • En proceso |
| • Nuevas | • De Infraestructura |
| • De conservación y mantenimiento | • Por requerimiento de otras Gerencias o Entidades |
| • Por reportes del C.C. | • Notas periodísticas |
| • Programas Cíclicos | |

– La Dirección de Operación considerará las siguientes Fases en la programación de cada obra:

- | | |
|--|--|
| • Estudios y proyectos específicos | • Acciones previas para convocar |
| • Procesos de Licitación y Contratación | • Ejecución de la obra |
| • Aspectos de infraestructura | • Acciones de previsión ambiental |
| • Proceso de prueba y puesta en marcha | • Terminación y recepción |
| • Conservación y mantenimiento | |

– La Dirección de Operación deberá contemplar los costos relativos a:

- Las investigaciones, asesorías, estudios y proyectos
- La Licitación
- La ejecución de la obra, pruebas y funcionamiento
- Las obras de infraestructura, complementarias y de preservación ambiental
- Trabajos de conservación y mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

19

XII

97

DE: 14

- Para que la Dirección de Operación esté en posibilidad de ejecutar cada obra, será menester que:
 - Se cuente con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado, en la partida correspondiente;
 - La obra esté incluida en el Programa de Inversiones autorizado
 - Se cuente con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de construcción, el programa de ejecución, el presupuesto y el programa de suministro.
 - Se cumplan los trámites o gestiones complementarias que se relacionen con la obra y los que deban realizarse conforme a las disposiciones del Departamento del Distrito Federal.
 - Que los trabajos sean acordes con los programas de desarrollo urbano, en su caso.
- La Dirección de Operación aplicará como criterios de evaluación para definir la prioridad de una obra, los siguientes:
 - Además de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, el uso e importancia del inmueble o instalación.
 - Las consecuencias por la falta de mantenimiento.
 - La correcta operación, funcionalidad y seguridad del S.T.C.
 - Solicitudes de emergencia y especiales.
- De igual manera, considerará por orden de importancia:
 - La operación del Organismo.
 - Los proyectos que coadyuven a mejorar la operación del Organismo.
 - La seguridad para el usuario, personal operativo y administrativo.
 - La conservación e imagen de instalaciones e inmuebles.
 - Las solicitudes especiales.
- Del análisis de cada solicitud de trabajos de obra pública, se deberá elaborar la justificación del gasto de inversión, el cual se estructura en base a la investigación previa realizada por la Gerencia



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

19

XII

97

DE: 14

Responsable o el DEPYMAG, e incluirá los procedimientos constructivos, los materiales a utilizar, los alcances y objetivos del trabajo y los recursos financieros por aplicar.

- En caso de que se requiera contratar o realizar estudios o proyectos, el organismo verificará si en sus archivos o en los de las entidades y dependencias afines existen estudios o proyectos sobre la materia. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos del Organismo, no procederá la contratación.
- En la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, deberá determinarse tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate, en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se atenderá a los costos que, en su momento, se encuentren vigentes.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

19

XII

97

DE: 14

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	ÁREA SOLICITANTE	Capta los requerimientos de obras de las unidades orgánicas a su cargo, conteniendo la documentación técnica inherente, y en su caso, la determinación del costo estimado en original y copia la cual conserva y remite el original a la Dirección de Operación
2	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	Recibe original de los requerimientos de obra pública de las áreas Solicitantes, en sus modalidades de obra nueva o conservación, remitiéndolos a la Gerencia de Línea o DEPYMAG, según corresponda.
3	GERENCIA DE LÍNEA DEPYMAG	Recibe y analiza los requerimientos de obra pública, realiza estudios de factibilidad los cuales conserva para su control. ¿Se puede realizar el proyecto?
3.1		No, se cancela. (TERMINA PROCEDIMIENTO)
3.2		Sí, elabora el Anteproyecto de Presupuesto Capítulos 3000 y 6000 y le anexa documentación soporte de requerimientos de obra y la envía a la Dirección de Operación.
4	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	Recibe el Anteproyecto de Presupuesto Capítulos 3000 y 6000 por área, con ellos integra el Anteproyecto Global de Presupuesto, obtiene copias y distribuye: Original del Anteproyecto Global.- Gerencia de Presupuesto. Para su trámite. Copia del Anteproyecto Global y originales de los Anteproyectos de Presupuesto.- Gerencia de Línea y Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública. Para la elaboración del anteproyecto del programa de licitaciones.
No	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

19

XII

97

DE: 14

ADMINISTRATIVA

5	GERENCIA DE PRESUPUESTO	Recibe y revisa el Anteproyecto Global de Presupuesto Capítulos 3000 y 6000, lo integra al anteproyecto global del Presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo, para enviarlo a la Secretaría de Finanzas del D.F. en original y copia. (Ver procedimiento para la Elaboración e Integración del Presupuesto)
6	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL D.F.	Recibe el Anteproyecto Global de Presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo en original y copia, lo revisa, asigna la disponibilidad presupuestal y lo regresa al Sistema de Transporte Colectivo, específicamente a la Gerencia de Presupuesto.
7	GERENCIA DE PRESUPUESTO	Recibe el Anteproyecto Global de Presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo con la disponibilidad presupuestal que se asignó, conserva el original y remite la copia a la Dirección de Operación.
8	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	Recibe copia del Anteproyecto Global de Presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo con la disponibilidad presupuestal y la remite a la Gerencia de Línea o al DEPYMAG.
9	GERENCIA DE LÍNEA DEPYMAG	Recibe Anteproyecto Global de Presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo con la disponibilidad presupuestal y, en base a las prioridades ajusta necesidades de las Áreas Solicitantes del Sistema de Transporte Colectivo y formula la versión actualizada del Programa de Inversiones Capítulos 3000 y 6000 mismo que somete a consideración de las Áreas Solicitantes.

No

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

19

XII

97

DE: 14

- 9.1 De no estar de acuerdo, se realizan las modificaciones necesarias.
(Reinicia procedimiento en la actividad N° 9).
- 9.2 De estar de acuerdo recaba la firma de conformidad del Titular del Área Solicitante en el Programa de Inversiones, obtiene copia y turna a los Departamentos de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos o al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, para que en su caso ajuste su programa de licitaciones, conserva la copia del Anteproyecto Global de Presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo.
- 10 GERENCIA DE LÍNEA(DMAR)
DEPYMAG Recibe el Programa de Inversiones con la firma de conformidad y en su caso remite a la Subjefatura de Supervisión o Mantenimiento según corresponda.
- 11 DMAR
DEPYMAG
SUBJEFATURA DE SUPERVISIÓN
O MANTENIMIENTO Recibe el Programa de Inversiones, elabora el catálogo de conceptos y especificaciones de obra, cuantifica las cantidades de obra (volúmenes) dando su visto bueno y en el caso del DEPYMAG lo envía al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, por conducto de la Jefatura.
- 12 DMAR
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN
Y COSTOS DE OBRA PÚBLICA Recibe el Programa de Inversiones, catálogo de conceptos y cantidades de obra y realiza el análisis de precios unitarios.
- 13 DMAR
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN
Y COSTOS DE OBRA PÚBLICA Elabora el Presupuesto Base y procede a determinar el tipo de contratación, clasificándolo de acuerdo al monto del presupuesto y archiva documentos.

(Continúa en los Procedimientos para la Contratación de Obra mediante Adjudicación Directa; Contratación de Obra mediante Invitación Restringida, y Contratación de Obra mediante Licitación Pública)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA


PAG. 12

19

XII

97

DE: 14

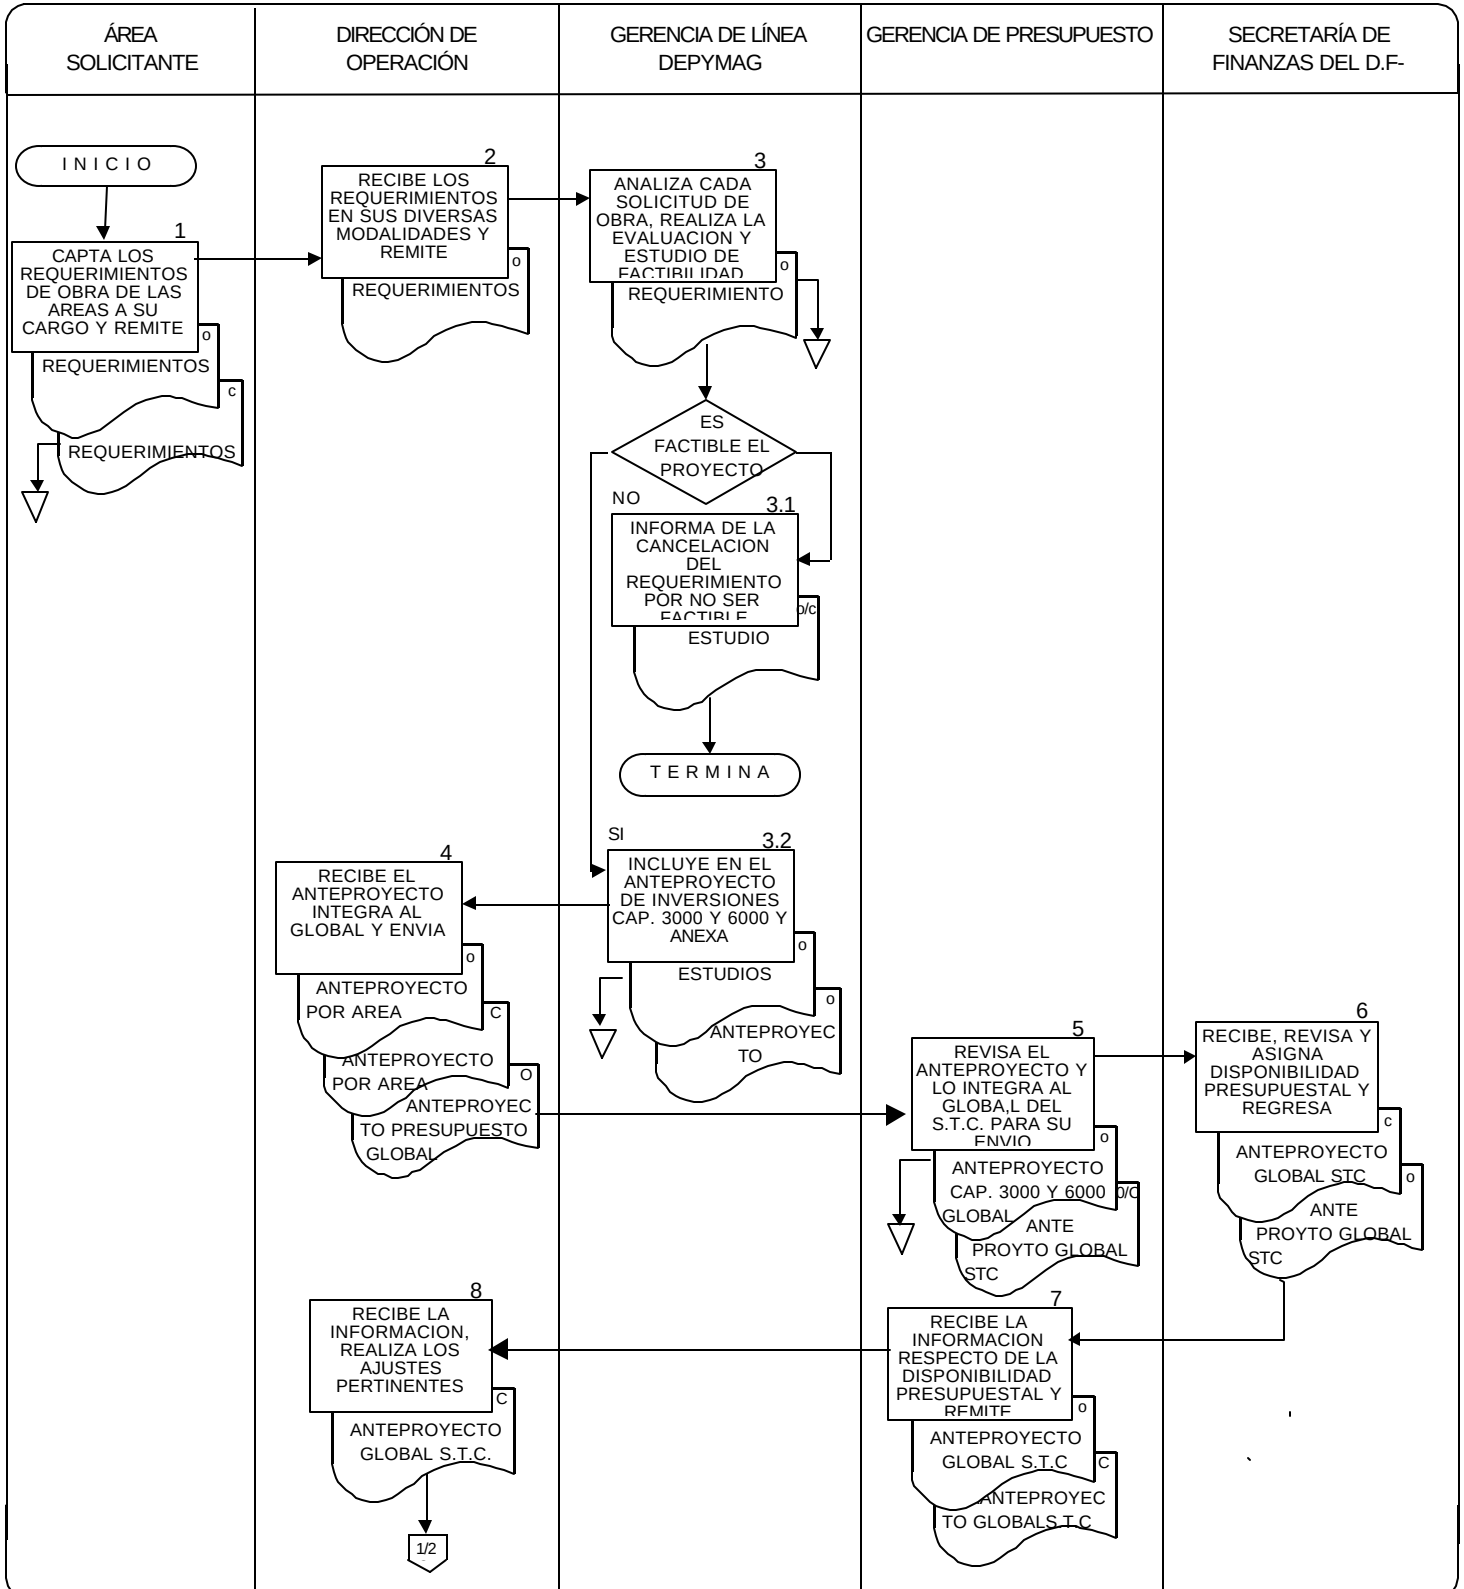



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

19


XII

97

DE: 14

GERENCIA DE LÍNEA(DMAR)
DEPYMAG

DMAR (SUBJEFATURA DE SUPERVISION).
DEPYMAG (SUBJEFATURA DE SUPERVISION O MANTTO.)

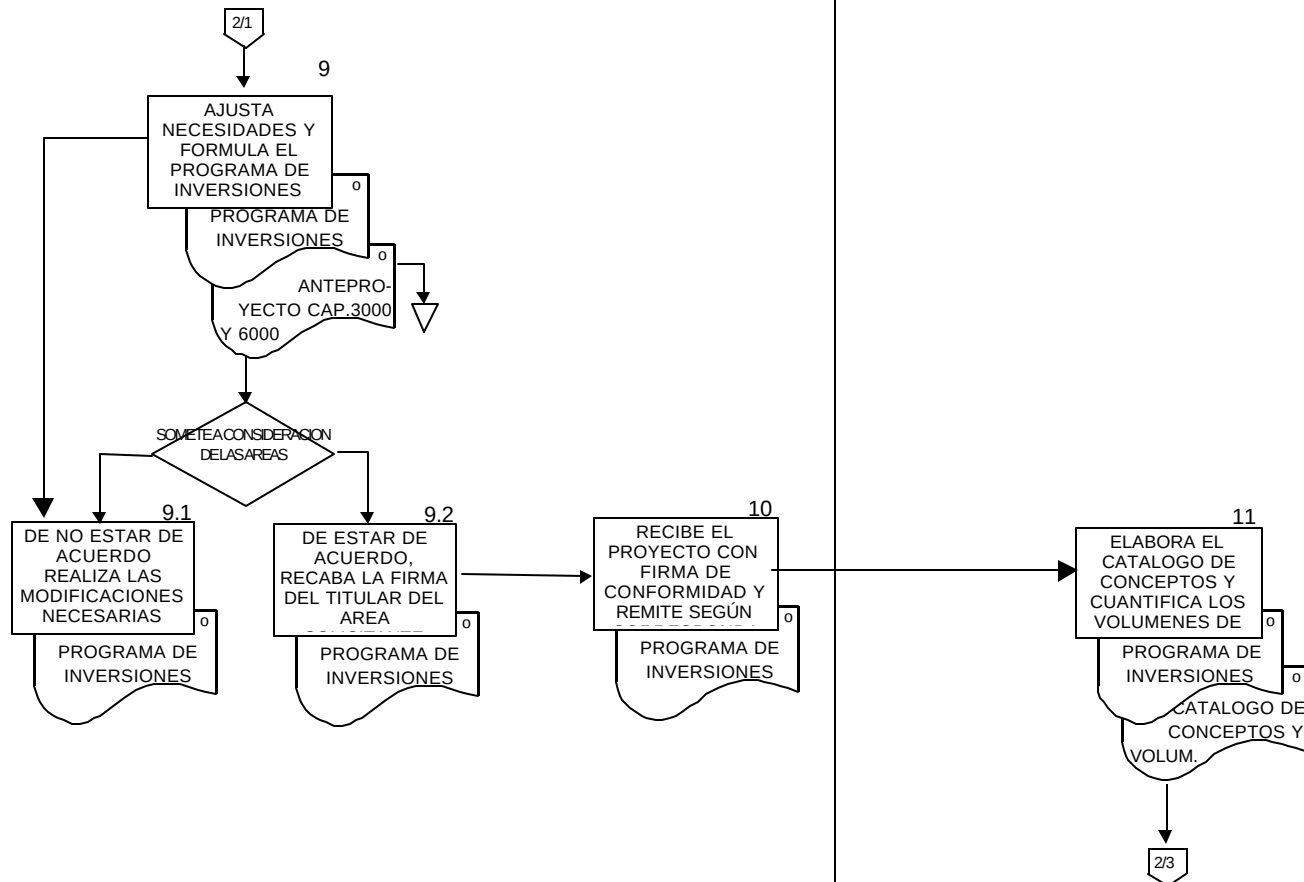



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14


19

XII

97

DE: 14

UNIDAD DE OBRA PÚBLICA

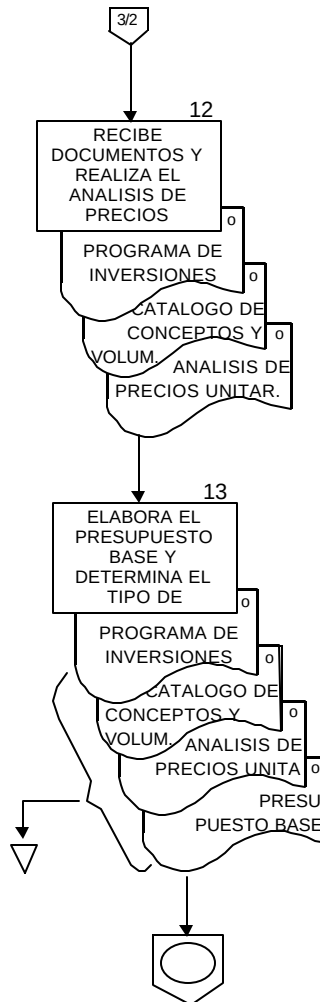

CONTINUA EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE OBRA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA; CONTRATACION DE OBRA MEDIANTE INVITACION RESTRINGIDA, Y CONTRATACION DE OBRA MEDIANTE LICITACION PUBLICA.
