

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS**

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FOLIO

337

FECHA

27 - XI - 00

DATOS DEL PROYECTO

Nombre : Procedimiento para el Análisis de Precios Unitarios para Trabajos Extraordinarios de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

OBJETIVO : Determinar los Precios Unitarios aplicables a conceptos no contemplados en el Catálogo de Conceptos Original de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma que el Sistema de Transporte Colectivo celebre con terceros, de acuerdo con la normatividad aplicable y garantizando las mejores condiciones para el S.T.C.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento y Diagrama de Flujo.
Total de páginas 14.

DIRECCION (ES)Subdirección General Técnica

Vo. Bo.

RESPONSABLE (S)Ing. Miguel Gerardo Benítez BustosSubdirección General de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Nombre y firma del ResponsableLic. José González PedreroDirección de Operación

Vo. Bo.

Nombre y firma del ResponsableIng. Luis Canut AbárcaDirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

Nombre y firma del ResponsableIng. E. Mario J. Zepeda y MartínezGerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Nombre y firma del ResponsableIng. José Carlos OrozcoNombre y firma del Responsable**AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL**VIGENTE A PARTIR DE: 27 - XI - 00ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG. 1

27 XI 00 DE: 14

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG. 2

27 XI 00 DE: 14

OBJETIVO:

Determinar los Precios Unitarios aplicables a conceptos no contemplados en el Catálogo de Conceptos original de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma que el Sistema de Transporte Colectivo celebre con terceros, de acuerdo con la normatividad aplicable y garantizando las mejores condiciones para el S.T.C.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG. 3

27 XI 00 DE: 14

POLITICAS DE OPERACIÓN:

POLÍTICAS GENERALES

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en los análisis de precios unitarios para trabajos extraordinarios relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, correspondientes a contratos que el Sistema de Transporte Colectivo celebre con terceros.
- Las actividades correspondientes se registrarán por lo que se establece en las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de los Servicios Relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, aplicables en todo lo que no se oponga a la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las mismas, a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como lo estipulado en el Libro 9 de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, no contempladas en las Reglas Generales.
- Para efectos del presente, se entenderá por:
 - **S.T.C.-** Las siglas con que se identifica al Sistema de Transporte Colectivo.
 - **Contratista.-** La persona física o moral que celebre contratos para la realización de obra pública y de servicios relacionados con la misma con el S.T.C..
 - **Unidad de Obra Pública.-** Las unidades administrativas facultadas para llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de las obras públicas y servicios relacionados con la misma que requiera el S.T.C. para la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de sus inmuebles e instalaciones. Para tal efecto, se consideran como Unidades de Obra Pública: la Dirección de Operación, la Gerencia de Líneas 1, 3 y 4, la Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y “B”, y la Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y “A”.
 - **D. E. P. Y. M. A. G.-** Las siglas con que se identifica al Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales, adscrito a la Dirección de Operación.
 - **D.L.Y.C.O.P.-** Las siglas con que se identifica al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Operación.
 - **D. M. A. R.-** Las siglas con que se identifica indistintamente a cualquiera de los Departamentos de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de las Gerencias de Líneas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG. 4

27 XI 00 DE 14

- **Supervisor de Obra.-** A la persona designada por la Unidad de Obra Pública para la revisión de los trabajos.
- **Reglas Generales.-** A las Reglas Generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 1982.

POLÍTICAS PARTICULARES

- De acuerdo con lo establecido en el punto 3.3.4. de las Reglas Generales, así como con lo estipulado en el Libro 9 de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, cuando a juicio del S.T.C. sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios, que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procederá de la siguiente forma:

I. Trabajos extraordinarios a base de Precios Unitarios.

- A) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, el S.T.C. estará facultado para ordenar al Contratista su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
- B) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y el S.T.C. considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención del Contratista y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
- C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores, el S.T.C. aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador. En ambos casos el Contratista, estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
- D) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos A), B) y C), el Contratista a requerimiento del S.T.C. y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver el S.T.C. en un plazo no mayor de treinta días naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG.

5

27

XI

00

DE: 14

refiere este inciso, el Contratista se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

E) En el caso de que el Contratista no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el párrafo D) anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, el S.T.C. podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, en los términos de la sección correspondiente, de las Reglas Generales, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc., que intervendrá en estos trabajos.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma serán a cargo del Contratista.

II. Trabajos extraordinarios por administración directa.

- Si el S.T.C. determinare no encomendar al Contratista los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado I, podrá realizarlos en forma directa.

III. Trabajos extraordinarios por tercera persona.

- Si el S.T.C. no opta por ninguna de las soluciones señaladas en los apartados I y II de la regla, podrá encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a tercera persona, conforme a las disposiciones legales relativas.
- El área responsable de la recepción y trámite de la solicitud, de los precios unitarios para trabajos extraordinarios, será el D.E.P.Y.M.A.G. y el D.M.A.R., de acuerdo con su ámbito de competencia.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

- El Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública o el área de Costos de los Departamentos de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, serán quienes analicen, revisen, establezcan y autoricen los precios unitarios para trabajos extraordinarios.
- Considerando las diversas necesidades de la obra, el Supervisor de Obra solicitará al Contratista la realización de los trabajos extraordinarios, requiriéndole que presente su solicitud de revisión y en su caso, autorización de los mencionados precios unitarios, a los cuales deberá anexar el presupuesto, así como matrices de precios unitarios, notas de bitácora, croquis dimensionados y apoyo fotográfico, debidamente avalados por el Supervisor de Obra.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG. 6

27 XI 00 DE: 14

- Para contratos que se rigen por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se deberá observar además, lo siguiente:
 - El Contratista tendrá un plazo de 30 días calendario, contados a partir de su registro en bitácora, para presentar su solicitud de revisión ante el D.E.P.Y.M.A.G. o el D.M.A.R., según corresponda.
 - El S.T.C. tendrá un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la recepción de la solicitud de revisión de precios unitarios para trabajos extraordinarios, para comunicar al Contratista por escrito la autorización o rechazo de dicha solicitud.
- Para contratos que se rigen por la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se deberá observar además, lo siguiente:
 - Los plazos que tiene el Contratista para la presentación de precios unitarios modificados o fuera de catálogo del contrato, cuando las políticas administrativas, bases y lineamientos señalen que es éste el que debe presentarlos, será de 30 días hábiles, contados a partir de su registro en bitácora, para presentar su solicitud de revisión ante el D.E.P.Y.M.A.G. o el D.M.A.R., según corresponda. De lo contrario, el S.T.C. tendrá la facultad de determinarlos de acuerdo a lo señalado en las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, en su Libro N° 9.
 - En este caso, el S.T.C. tendrá un plazo que no deberá ser posterior a los 15 días hábiles de la recepción de la solicitud de revisión de precios unitarios para trabajos extraordinarios, para comunicar al Contratista por escrito la autorización o rechazo de dicha solicitud.
 - Cuando el S.T.C. sea el que debe presentar el análisis, éste deberá realizarse en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados a partir de su registro en la bitácora para presentar su solicitud de autorización, en este caso, el S.T.C. tendrá un plazo que no deberá ser posterior a los 15 días hábiles de la recepción de la solicitud de autorización de precios unitarios para trabajos extraordinarios, para comunicar al Contratista por escrito la autorización o rechazo de dicha solicitud.
- Los precios unitarios para trabajos extraordinarios se estudiarán y analizarán a fecha de licitación o fecha de realización de los trabajos.
- La autorización de los precios unitarios para trabajos extraordinarios deberá efectuarse mediante oficio, una vez conciliados por ambas partes.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG.

7

27

XI

00

DE: 14

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	SUPERVISOR DE OBRA	Identifica la necesidad de llevar a cabo trabajos no comprendidos en el proyecto y programa original, estima costos para determinar la conveniencia de la ejecución de los trabajos.
2		Analiza la repercusión en el análisis de la obra, por la no ejecución de los trabajos y asienta en la bitácora la autorización de los mismos.
3		Elabora reporte donde señala con precisión los conceptos que correspondan y lo entrega a la Subjefatura correspondiente para su análisis.
4	SUBJEFATURA DE SUPERVISION (DEPYMAG) AREA DE SUPERVISION (DMAR)	Recibe el reporte del Supervisor y lo conserva
5	SUPERVISOR DE OBRA	Solicita al Contratista los precios unitarios para trabajos extraordinarios, acompañados de la documentación respectiva.
6	CONTRATISTA	Elabora los precios unitarios correspondientes a los trabajos extraordinarios y los somete a consideración del S.T.C. mediante Solicitud de revisión en original y copia.
7	SUPERVISOR DE OBRA	Recibe del Contratista la Solicitud de revisión de precios unitarios para trabajos extraordinarios con la documentación justificatoria, firma y acusa recibo en copia.
8		Revisa la integración de la Solicitud y determina: Presenta el Contratista la documentación completa?



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG.

8

27

XI

00

DE: 14

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
8.1	SUPERVISOR DE OBRA	No, promueve con el Contratista la integración de la documentación en la forma y términos que corresponda. (Reinicia en la Actividad N° 6)
8.2		Sí, revisa la especificación del concepto, así como que los materiales, mano de obra y equipo sean los adecuados para la realización de los trabajos y avala la solicitud.
9		Elabora oficio de solicitud de análisis y autorización en original y copia y distribuye según corresponda: Corresponde a contratos a cargo de las Gerencias de Líneas?
9.1	D.L.Y.C.O.P.	Sí, recaba firma del titular del D.M.A.R., obtiene fotocopia del oficio y de la documentación y distribuye: Original del oficio y de la documentación.- Área de Costos del D.M.A.R. Copia del oficio y de la documentación.- Archivo. (Continúa en la actividad N° 9)
9.2		No, recaba firma del titular del D.E.P.y.M.A.G., obtiene fotocopia del oficio y de la documentación y distribuye: Original del oficio y de la documentación.- Depto. de Licitación y de Costos de Obra Pública. Copia del Oficio y de la documentación.- Archivo.
10	D.L.Y.C.O.P.	Recibe oficio y documentación y turna a la Subjefatura de Costos de Obra Pública, para su atención.
11	SUBJEFATURA DE COSTOS DE OBRA PÚBLICA (D.L.Y.C.O.P.) ÁREA DE COSTOS (D.M.A.R.)	Recibe documentos, extrae de su archivo el Catálogo original y procede a la revisión de los precios unitarios para trabajos extraordinarios comparándolos con los contemplados en el catálogo original, identificando conceptos similares a los solicitados a efecto de tomar rendimientos y costos de mano de obra, así como costos de materiales y equipo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG.

9

27

XI

00

DE: 14

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
12	SUBJEFATURA DE COSTOS DE OBRA PÚBLICA (D.L.Y.C.O.P.) ÁREA DE COSTOS (D.M.A.R.)	En caso de que la especificación no sea precisa o se presente incompleta, solicita al área de supervisión que se complemente para avalarla por escrito.
13		Elabora relación de materiales y equipo que no se encuentren dentro del catálogo original y cotiza los mismos en el mercado.
14		De acuerdo con la especificación y en su caso, a los soportes gráficos, revisa la cantidad de los materiales propuestos por el Contratista.
15		Concilia con el Contratista rendimientos de mano de obra, equipo y herramienta y una vez que están de acuerdo ambas partes, firman de conformidad la matriz de precios unitarios.
16		Elabora en original y tres copias oficio de resolución y procede según corresponda:
16.1		Para Gerencias de Líneas, recaba firma del titular del Área de Costos, obtiene tres copias y distribuye de la siguiente manera: Original del oficio y solicitud.- Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos correspondiente. Copia del oficio. Área de Supervisión. Copia del oficio.- Contratista. Copia del oficio.- Archivo.
16.2		Para Áreas Centrales, recaba firma del titular del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, obtiene tres copias y distribuye: Original del oficio y solicitud.- Depto. de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales. Copia del oficio.- Subjefatura de Supervisión. Copia del oficio.- Contratista. Copia del oficio.- Archivo D.L.y.C.O.P.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG.

10

27

XI

00

DE: 14

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
17	D.E.P.Y.M.A.G. D.M.A.R.	Recibe oficio y solicitud, archiva oficio y con base en los conceptos y precios para trabajos extraordinarios autorizados, elabora Nota de Bitácora, señalando al Contratista la forma y términos que regirán la realización de los trabajos.
18	CONTRATISTA	Firma la Nota de Bitácora, acepta e inicia la realización de los trabajos. (CONTINÚA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG.

11

27

XI


00

DE: 14

SUBJEFATURA DE SUPERVISION
(DEPYMAG)
AREA DE SUPERVISION (DMAR)

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA

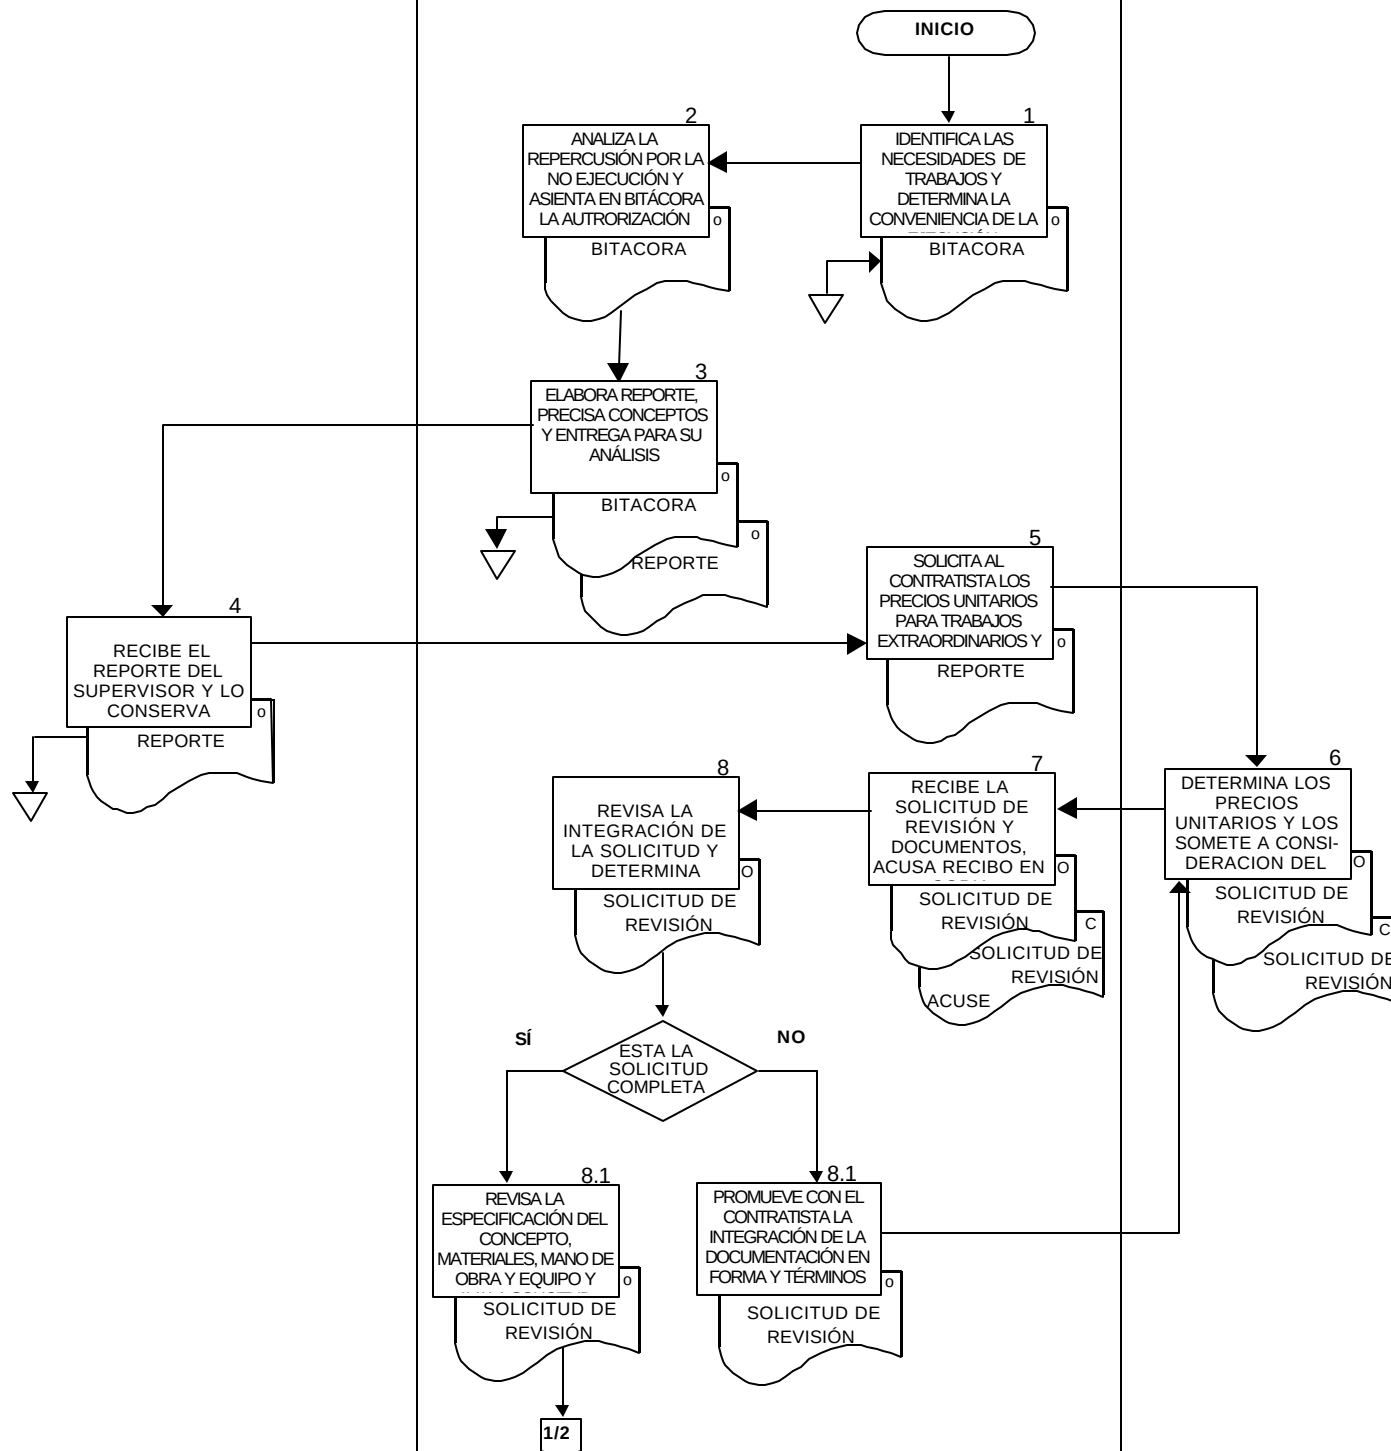



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG.

12

27

XI


00

DE: 14

SUBJEFATURA DE SUPERVISIÓN (DEPYMAG)
ÁREA DE SUPERVISIÓN (DMAR)

SUBJEFATURA DE COSTOS (DLYCOP)
ÁREA DE COSTOS (DMAR)

DLYCOP

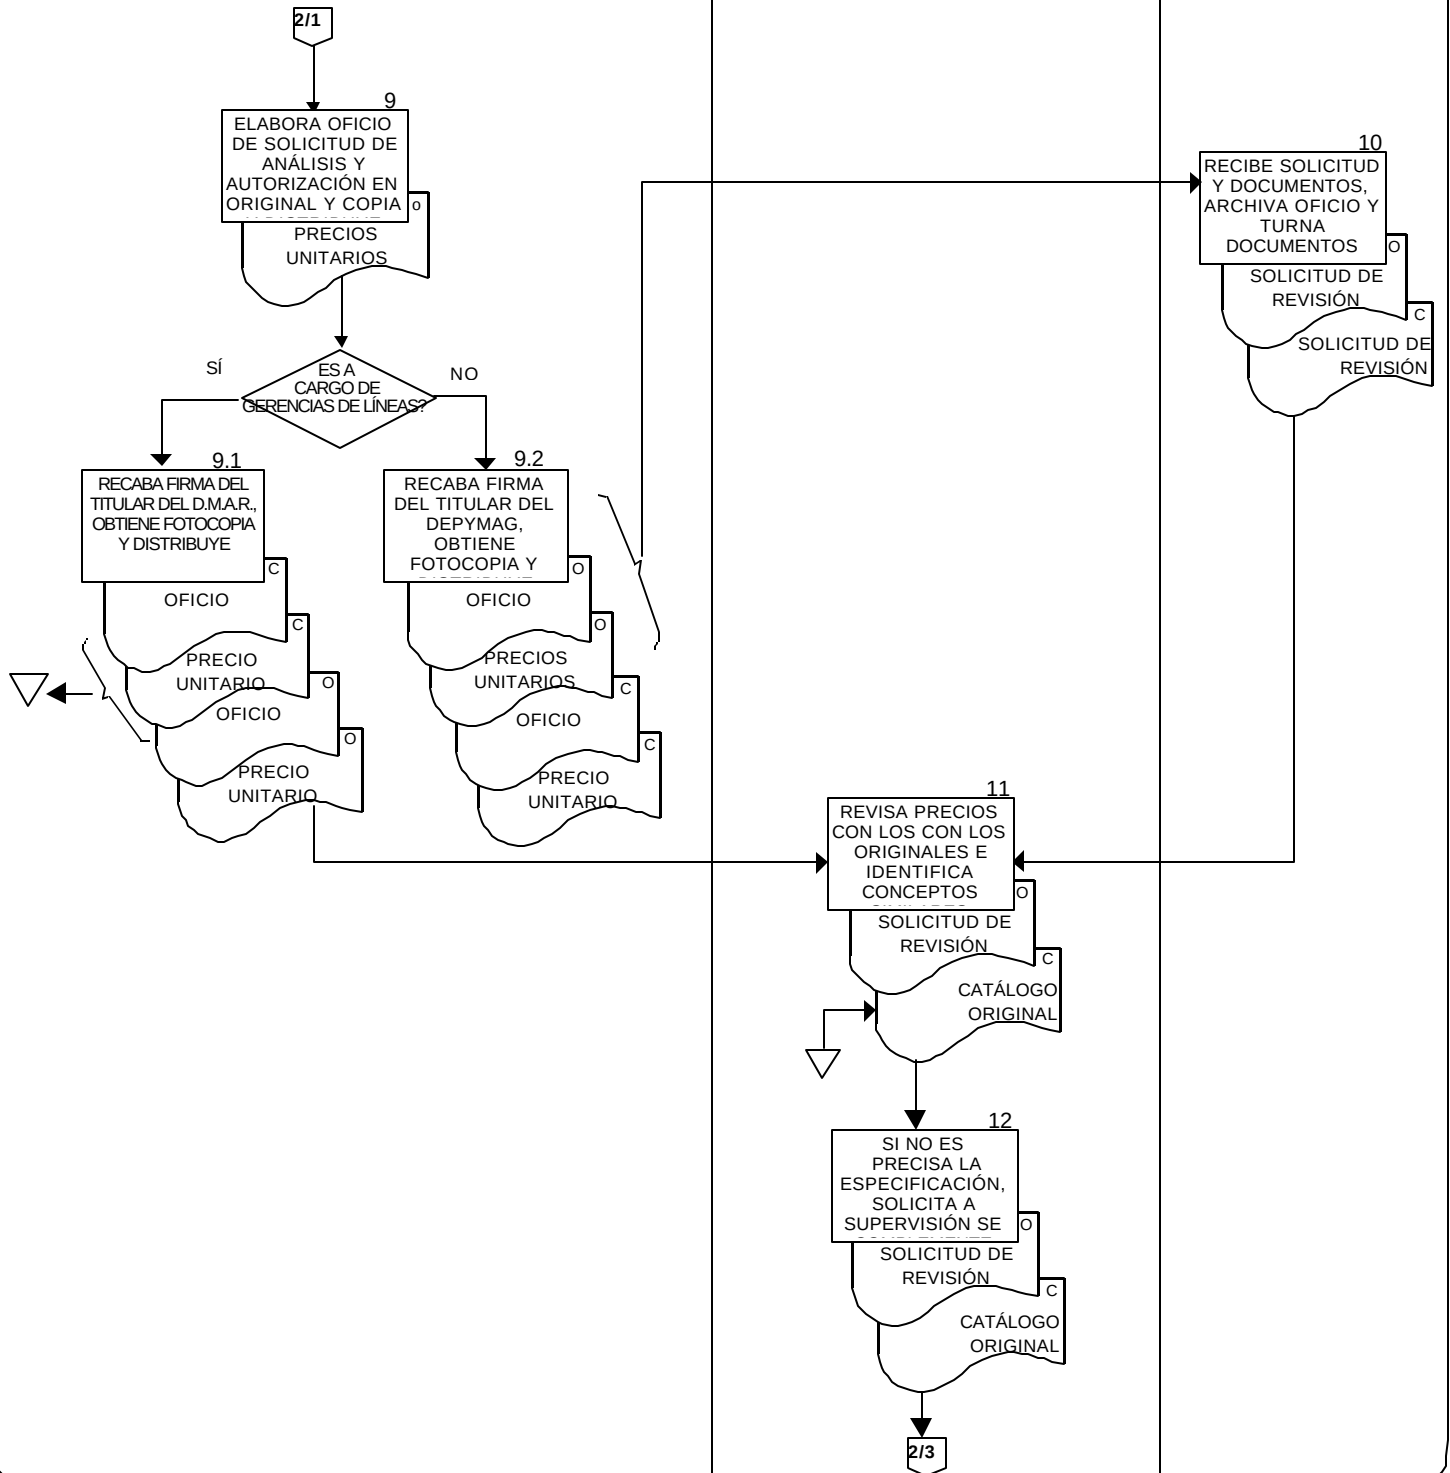



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA PAG.

13

27

XI

00

DE: 14

SUBJEFATURA DE COSTOS (DLYCOP)
ÁREA DE COSTOS (DMAR)

DLYCOP
DMAR

CONTRATISTA

