



SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

199

FECHA

6 - XI - 00

NOMBRE: Procedimiento para la Recepción de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

OBJETIVO: Llevar a cabo la recepción de los trabajos relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, que los contratistas y prestadores de servicios hayan realizado en las áreas e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, asegurando el debido cumplimiento de los contratos celebrados.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de las Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Llenado. Total de Páginas 18.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 1 - VI - 1994

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica Vo. Bo. Ing. Miguel Gerardo Requis Bustos

Subdirección General de Administración y Finanzas Vo. Bo. Lic. José González Pedrero

Dirección de Operación Vo. Bo. Ing. Luis Canut Abarca

Dirección de Programación y Presupuesto Vo. Bo. M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez

Gerencia de Organización y Sistemas Vo. Bo. Ing. José Cartas Orozco

OBSERVACIONES: Este procedimiento sustituye y actualiza al de mismo número de folio, de nombre Recepción de Obra Pública, de fecha 1 - VI - 94.




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

6

XI

00

DE: 18

RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

6

XI

00

DE: 18

OBJETIVO

Llevar a cabo la recepción de los trabajos relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, que los contratistas y prestadores de servicios hayan realizado en las áreas e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, asegurando el debido cumplimiento de los contratos celebrados.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

6

XI

00

DE: 18

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, a cargo del Sistema de Transporte Colectivo.
- Para los efectos del presente documento se entenderá por:
 - **Ley.-** A la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
 - **S.T.C.-** Las siglas con que se identifica al Sistema de Transporte Colectivo.
 - **Contratista.-** La persona física o moral que celebre con la Entidad contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma.
 - **Unidad de Obra Pública.-** Las unidades administrativas facultadas para llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de las obras públicas y servicios relacionados con la misma que requiera el S.T.C. para la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de sus inmuebles e instalaciones.
 - **Supervisor de Obra.-** A la persona designada por la Unidad de Obra Pública para la revisión de los trabajos.
- Para los efectos de este procedimiento, con base en la Ley, se considera Obra Pública:
 - A. La obra, dentro de la cual podrán estar:
 - I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;
 - II. Los trabajos de localización, exploración geotécnica y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;
 - III. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;
 - IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable en la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Distrito Federal, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio público a cargo del S.T.C.;



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

6

XI

00

DE: 18

V. El suministro de materiales, mobiliario y equipos que se vayan a incorporar a obras nuevas, a las de rehabilitación o aquellas que se construyan para su mejoramiento;

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

VII. Los trabajos destinados a la preservación, mantenimiento y restauración del medio ambiente, y

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga a las fracciones anteriores.

B. Servicios Relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán estar:

I. Estudios previos;

II. Estudios Técnicos;

III. Proyectos

IV. Supervisión de obras

V. Coordinación de Supervisión;

VI. Gerencia de Obra;

VII. Supervisión de Estudios y Proyectos;

VIII. Administración de Obras;

IX. Consultorías;

X. Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de la Ley.

C. Proyecto Integral.- Las acciones que comprenden el desarrollo de un trabajo, incluyendo investigaciones previas, estudios, diseño, elaboración del proyecto, la construcción, pruebas e inicio de operación del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnología.

– La Dirección de Operación, tendrá a su cargo la responsabilidad de dirigir, coordinar y controlar los procesos inherentes a la obra pública requerida por el S.T.C., ya sea por administración directa o por obra contratada.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

6

XI

00

DE: 18

- El titular de la misma podrá delegar esta responsabilidad en las unidades administrativas de la propia Dirección que considere pertinente, que se denominarán como Unidades de Obra Pública.
- Al efecto, son Unidades de Obra Pública las siguientes:
 - En el caso de obras relativas a las instalaciones de la Red del S.T.C.:
 - ◊ La Gerencia de Líneas 1, 3 y 4.
 - ◊ La Gerencia de Líneas 2, 5 y 6.
 - ◊ La Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y “A”
 - En el caso de obras relativas a las instalaciones de las áreas centrales.
 - ◊ El Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales, dependiente de la Dirección de Operación.
- El Contratista comunicará **mediante oficio** a la Unidad de Obra Pública la terminación de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los diez días hábiles anteriores a la terminación y ésta verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.
- Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Unidad de Obra Pública procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido en el contrato.
- La Unidad de Obra Pública, programará dentro del plazo establecido en el contrato el acto de recepción, comunicando al contratista mediante oficio la fecha, hora y lugar en que se realizará dicho acto, turnando copia para las áreas del S.T.C. involucradas.
- Las Unidades de Obra Pública podrán realizar recepciones parciales, considerando la normatividad aplicable vigente, en los siguientes casos:
 - a) Cuando se determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
 - b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, a juicio de la Unidad de Obra Pública existan trabajos terminados y éstas partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

6

XI

00

DE: 18

- c) Cuando anticipadamente concurren razones de interés general, la Unidad de Obra Pública y el Contratista podrán dar anticipadamente por terminado el contrato.
- d) Cuando se determine la suspensión de la obra o se rescinda el contrato por causas imputables al S.T.C. o por causas imputables al Contratista, quedando a juicio de la Unidad de Obra Pública la recepción parcial de los trabajos.
- e) Cuando la autoridad competente declare rescindido el contrato, estando a lo dispuesto por la resolución correspondiente.
- Tanto en caso de recepción total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos a), b), c) y d), se procederá a recibir los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de la verificación que de su terminación haga la Unidad de Obra Pública, de la fecha del requerimiento de entrega que ésta haga o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores.
- En todos los casos de recepción de la obra, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos señalados en el contrato, para lo cual deberá presentar la garantía correspondiente.
- En caso de que existan detalles de la obra, éstos quedarán asentados en el acta de recepción y el Contratista dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para la atención de los mismos a satisfacción del S.T.C.
- La Unidad de Obra Pública elaborará oficio para comunicar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal la terminación de los trabajos, precisando en el mismo la fecha, hora y lugar señalado para su recepción, a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto. Dicho oficio deberá ser firmado por el Director General del S.T.C.
- En la fecha señalada, el representante de la Unidad de Obra Pública, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente, recabando las firmas de quienes participan en el acto.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

6

XI

00

DE: 18

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	CONTRATISTA	Comunica mediante oficio a la Unidad de Obra Pública, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados.
2	UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	Turna oficio al área técnica responsable de la supervisión para su atención.
3	D.M.A.R. - D.E.P.Y.M.A.G. SUPERVISOR DE OBRA	Verifica que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en el contrato y archiva oficio. ¿Están terminados los trabajos?
3.1		No, elabora informe al respecto y entrega a la Unidad de Obra Pública, se registra avance de los trabajos en la bitácora de obra. (Continúa en la Actividad No. 6)
3.2		Sí, asienta nota en la bitácora de obra, programa recepción, informa a la Unidad de Obra Pública y procede a integrar documentación de finiquito.
4		Elabora acta con juegos de copias necesarios.
5		Elabora y entrega oficio comunicando al contratista, fecha, hora y lugar en que se efectuará el acto de recepción, marcando copia a la Unidad de Obra Pública y Áreas del S.T.C. involucradas, recabando acuse en copia para su archivo.
6	UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	Recibe informe del Supervisor de Obra, referente al avance de la realización de los trabajos. Están terminados los trabajos?
6.1		No, elabora en original y 2 copias oficio donde manifiesta al contratista que los trabajos aún no han sido concluidos y distribuye de la siguiente manera: Original del oficio.- Contratista. Copia N° 1 del oficio.- Unidad de Obra Pública. Acuse. Copia N° 2 del oficio.- Dirección de Operación. (Reinicia procedimiento actividad N° 1)




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

6

XI

00

DE: 18

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
6.2	UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	Están terminados, elabora en original y tres copias oficio dirigido a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, comunicándole la terminación de los trabajos, fecha, lugar y hora señaladas para su recepción, recaba firma del Director General y distribuye de la siguiente manera: Original del oficio.- Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. Copia N° 1.- Contraloría Interna. Copia N° 2.- Dirección de Operación. Acuse. Copia N° 3.- Unidad de Obra Pública. Expediente del Contrato.
7	D.M.A.R. - D.E.P.Y.M.A.G. SUPERVISOR DE OBRA	Lleva a cabo el acto de recepción en la fecha, lugar y hora señalados, requisita el acta correspondiente, recaba firma de los que en el acto intervienen, obtiene copias y distribuye: Original.- Unidad de Obra Pública. Para su archivo. Copia.- Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. Copia.- Contraloría Interna. Copia.- Contratista. Copia.- Supervisor de Obra. Copia.- En su caso, Supervisión Externa. TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

6

XI


00

DE: 18

CONTRATISTA

UNIDAD DE OBRA PÚBLICA

D.M.A.R. - D.E.P.Y.M.A.G.
SUPERVISOR DE OBRA

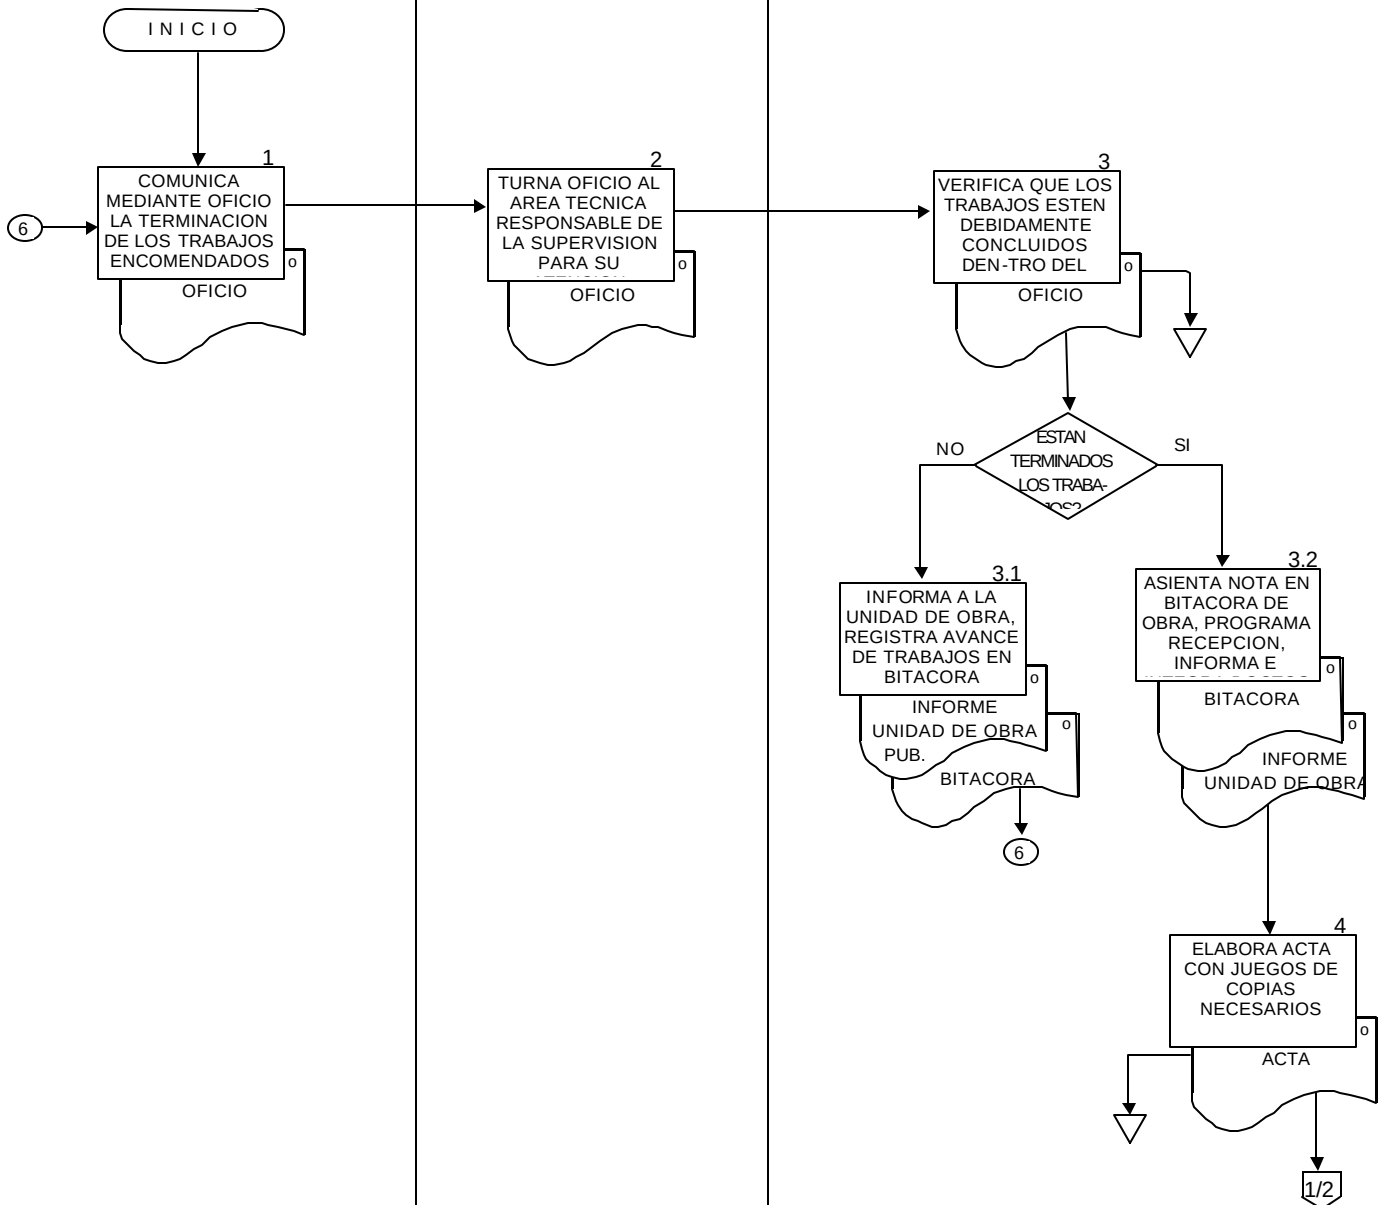



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

6


XI

00

DE: 18

D.M.A.R. - D.E.P.Y.M.A.G.
SUPERVISOR DE OBRA

UNIDAD DE OBRA PÚBLICA

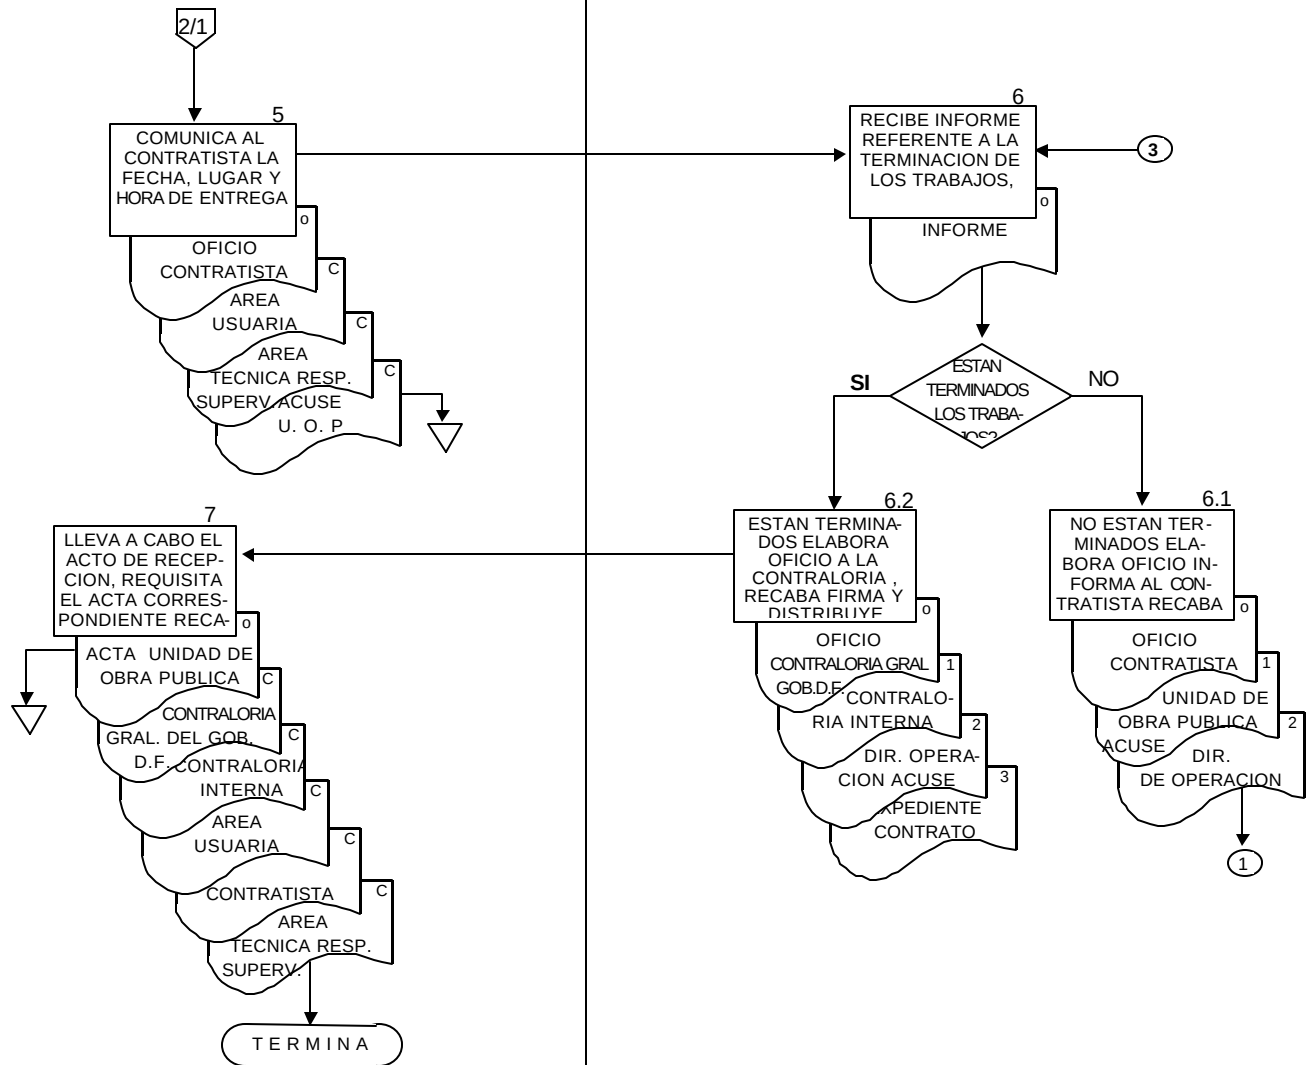




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

6

XI

00

DE: 18

RELACIÓN DE FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- ACTA DE RECEPCIÓN



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

6

XI

00

DE: 18

“ACTA DE RECEPCIÓN”

CONTRATO N° (1)

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de México D.F., siendo las ⁽²⁾_____ horas del día ⁽³⁾_____ de 200____, en cumplimiento al Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y al Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se formula la presente Acta

Intervienen en este Acto, el Contratista y los Funcionarios que se mencionan al final de la presente .

1.- Nombre de la Obra: (4)

2.- Localización: (5)

3.- Descripción de las obras o servicios que se reciben: (6)

4.- Fecha real del término de la obra (7)

5.- Partida Presupuestal: (8)

6.- Contrato Número : (9)

7.- Fianza otorgada por: (10)

No. (11) de fecha (12)

8.- Fecha de vencimiento de la fianza. (13)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

6

XI

00

DE: 18

HOJA N° . 2

CONTRATO N°

(1)

Esta Fianza subsistirá como garantía por un año, a partir de la fecha de la firma de la presente Acta de acuerdo al Artículo 58, Párrafo Segundo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y el Artículo 36, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

8. Estado de Cuenta con I.V.A.:

Importe del Contrato: (14)

Estimación No 1: (15)

Estimación No. 2:

Estimación No. 3:

Estimación No. 4:

Estimación No. 5

Ajustes de Costos:

Importe Ejercido: (16)

Deducciones : (17)

Saldo por Cancelar: (18)

Sumas: (19)

Saldos a Favor o en Contra

9. Declaran los presentes que de acuerdo a la observación de la obra, los trabajos que se mencionan en el inciso tres, se encuentran realizados.

10. ¿Existen observaciones, desperfectos ^(20) **y/o detalles**? SI o NO En caso afirmativo, se anexará en la presente Acta, una relación detallada de los mismos y el contratista tendrá un plazo que no excederá de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la firma de la presente para realizar dichos trabajos a satisfacción del área responsable (ver hoja No. 4).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

6

XI

00

DE: 18

HOJA N° 3

CONTRATO N°

(1)

11. El contratista, no obstante la recepción de la obra, queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y de acuerdo al Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Leída la presente Acta firma de conformidad los funcionarios y personas físicas o morales que intervinieron en este acto.

(21)

CONTRATISTA

(22)

SUPERVISIÓN S.T.C.

(23)

JEFE DEL DEPTO. DE

(24)

CONTRALORÍA GENERAL DEL
DISTRITO FEDERAL

(25)

GERENTE DE LÍNEAS

(26)

CONTRALORÍA INTERNA DEL S.T.C.


(27)

SUPERVISIÓN EXTERNA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

6

XI

00

DE: 18

HOJA N° 4

CONTRATO N° (1)

Anexo de Observaciones, Desperfectos y/o Detalles:

Fecha : (28)

OBSERVACIONES, DESPERFECTOS Y/O DETALLES:

(29)

ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES, DESPERFECTOS Y/O DETALLES

(30)

Con esta fecha / / , se verifica que las observaciones, **desperfectos y/o detalles** contenidas en esta Acta han sido corregidas

Al calce aparece la firma del responsable de la liberación de la misma

RÚBRICAS : (31)




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

6

XI

00

DE: 18

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LA FORMA

“ACTA DE RECEPCIÓN”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Hacer constar la terminación y recepción de los trabajos para la atención de las averías inherentes a la obra civil, desarrollados en las instalaciones de la Entidad.

FORMULACIÓN A CARGO DE: DMAR – DEPYMAG Permanencia Responsable.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual.

No. DE EJEMPLARES: Original y “N” copias.

DISTRIBUCIÓN:

- Original.- Unidad de Obra Pública. Para su archivo.
- Copia.- Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.
- Copia.- Contraloría Interna.
- Copia.- Contratista.
- Copia.- Supervisor de Obra.
- Copia.- En su caso, Supervisión Externa..



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

6

XI

00

DE: 18

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“ACTA DE RECEPCIÓN”

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1.	CONTRATO	Número y clave del Contrato.
2.	SIENDO LAS_____HORAS	La hora en que se lleva a cabo el acto
3.	DEL DÍA____DE_____DEL 200__	El día, mes y año en que se lleva a cabo el acto de recepción.
4.	NOMBRE DE LA OBRA:	La descripción de los trabajos realizados.
5.	LOCALIZACIÓN:	La descripción del lugar donde se encuentra la obra realizada
6.	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	Una descripción breve del tipo de obra o servicio que se realizó
7.	FECHA REAL DEL TÉRMINO DE LA OBRA:	El día, mes y año de conclusión de los trabajos.
8.	PARTIDA PRESUPUESTAL:	La clave de la partida presupuestal que corresponda
9.	CONTRATO NÚMERO:	El número de contrato de la obra o servicio
10.	FIANZA OTORGADA POR:	El nombre de la afianzadora del contratista
11.	NO.	El número que corresponde a la fianza
12.	DE FECHA	La fecha de contratación de la fianza
13.	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FIANZA	El día, mes y año de vencimiento de la fianza.
14.	IMPORTE DEL CONTRATO:	El monto total del contrato
15.	ESTIMACIÓN N°:	El importe que se paga en cada estimación que es presentada por el Contratista
16.	IMPORTE EJERCIDO	El monto total ejercido a la fecha de recepción.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECTOR DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

6

XI

00

DE: 18

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
17.	DEDUCCIONES	El monto a deducir en la estimación final.
18.	SALDO POR CANCELAR:	El importe por concepto de deducciones aplicable al pago de la última estimación
19.	SUMAS: SALDOS A FAVOR O EN CONTRA	El saldo según corresponda a cargo o a favor del S.T.C., incluyendo ajustes de costos por pagar.
20.	SI O NO	Marcar con una X según corresponda, con respecto a observaciones, desperfectos y/o detalles.
21.	CONTRATISTA:	Nombre completo y firma del representante del Contratista
22.	SUPERVISIÓN S.T.C.	Nombre completo y firma del responsable de la supervisión del proyecto designado por la Entidad.
23.	JEFE DEL DEPTO.	Nombre completo y firma del Jefe de Departamento que corresponda.
24.	CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL	Nombre completo y firma del representante de dicho órgano de control, en caso de asistir.
25.	GERENTE DE LÍNEAS:	Nombre completo y firma del representante de la Gerencia de Líneas que corresponda.
26.	CONTRALORÍA INTERNA DEL S.T.C.	Nombre completo y firma del representante de la Contraloría Interna del S.T.C., en caso de asistir.
27.	SUPERVISIÓN EXTERNA	Nombre completo y firma del representante de la instancia responsable de la supervisión externa.
28.	FECHA	El día, mes y año en que se elabora el acta
29.	OBSERVACIONES, DESPERFECTOS Y/O DETALLES	En caso de existir observaciones, desperfectos y/o detalles, su descripción detallada y precisa.
30.	CON ESTA FECHA	La fecha en que se atiendan las observaciones, desperfectos y/o detalles del párrafo anterior
31.	RÚBRICAS:	Las rúbricas de los responsables de la atención a las observaciones, desperfectos y/o detalles.
