

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

274

FECHA

6 - II - 97

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para el Análisis y Determinación del Ajuste de Costos de Trabajos
Relacionados con la Obra Pública.

OBJETIVO : Determinar el factor de ajuste respectivo, en los casos en que se haya producido un incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto a la obra faltante de ejecutar, para mantener
actualizados los costos directos de los trabajos de obra pública y de los servicios relacionados con la
misma que prestan las compañías contratistas.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e
Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 17.

DIRECCION (ES)Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

RESPONSABLE (S)Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Requiza

Nombre y firma del Responsable

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 6-II-97LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE
COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

6

II

97

DE 17

**ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA**



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE
COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

6

II

97

DE 17

OBJETIVO

Determinar el factor de ajuste respectivo, en los casos en que se haya producido un incremento o decremento en el costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, para mantener actualizados los costos directos de los trabajos de obra pública y de los servicios relacionados con la misma que presentan los Contratistas.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

6

II

97

DE 17

POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en el análisis y determinación del ajuste de costos de los trabajos relacionados con la obra pública.
- Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por:
 - **Relativos o Indices.**- A los “Relativos de Precios de insumos para la Construcción” emitidos por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).
 - **Indice de Variación.**- Al índice establecido por la Secretaría de Obras y Servicios como el promedio de las tasas de interés propuestas.
 - **Contrato.**- los contratos de obra pública y/o servicios relacionados con la misma celebrados por el Organismo con las compañías contratistas.
 - **Programa de Obra.**- Al programa calendarizado de ejecución vigente de los trabajos de obra pública y/o servicios relacionados con la misma.
 - **Secretaría.**- La secretaría de hacienda y Crédito Público (S.H. y C.P.)
 - **S.E.C.O.D.A.M.**- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
 - **Organismo.**- El Sistema de Transporte Colectivo (S.T.C.).
 - **Compañía Contratista.**- La persona física o moral que celebre contratos con el Organismo.
 - **Área Responsable.**- Indistintamente, el Departamento de mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de la Subgerencia de Línea correspondiente y el Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales, según corresponda.
 - **Cámara.**- A la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción C.N.I.C.)
- En lo referente a los trabajos de obra pública y servicios relacionados con la misma, requeridos por las Gerencias de Línea, el Área Responsable de la recepción y trámite de la solicitud de ajuste de costos será el Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de la Subgerencia de Línea correspondiente.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

6

II

97

DE 17

- En lo referente a los trabajos de obra pública y servicios relacionados con la misma, requeridos por las Gerencias de Líneas, el Área Responsable de la recepción y trámite de la solicitud de ajuste de costos será el Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de la Subgerencia de Línea correspondiente.
- En lo referente a los trabajos de obra pública y servicios relacionados con la misma, requeridos por las demás instancias del Organismo, el Área Responsable de la recepción y trámite de la solicitud de ajuste de costos será el Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales.
- El Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública será responsable del análisis y determinación del factor de ajuste de costos de los trabajos aún no ejecutados, de acuerdo con el “Programa de Obra” vigente del “Contrato” respectivo.
- Los “Contratos” contendrán las declaraciones y estipulaciones referentes a los ajustes de costos, y el procedimiento de ajuste de costos que deberá ser determinado desde las bases de la licitación, el cual deberá regir durante la vigencia del “Contrato”.
- Los “Contratos” a precio alzado por ningún motivo podrán ser objeto de ajuste de costos. Dicho ajuste únicamente será aplicable en aquellos “Contratos” que se celebren sobre la base de precios unitarios.
- Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el “Contrato” que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al “Programa de Obra”, dichos costos podrán ser revisados, atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo “Contrato”. El aumento o reducción correspondiente deberá hacerse constar por escrito.
- No dará lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

6

II

97

DE 17

- El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el "Contrato" y se sujetará a lo siguiente:
 - Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al "Programa de Obra", o en caso de existir atraso no imputable a la Compañía Contratista .

Cuando el atraso sea por causa imputable por la Compañía Contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al "Programa de Obra".
 - Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los "Relativos o Indices" publicados en el diario oficial.

Cuando los "Relativos o Indices" que requiera la Compañía Contratista o el Organismo, no se encuentren dentro de los publicados por la S E C O D A M, estos procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen utilizando los lineamientos que expida la dicha Dependencia.

El Organismo procederá a calcular los "Relativos o Indices" de insumos, conforme a los precios investigados o que investiguen, prevalecientes durante los últimos días del mes de que se trate con respecto a los diez últimos días del mes anterior.
 - Los precios del "Contrato" permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y de utilidad originales, durante el ejercicio del "Contrato", el "Costo del Financiamiento" estará sujeto a las variaciones de las tasas de interés.
 - La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere convenio modificadorio alguno.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme alas "Estimaciones" correspondientes, deberá cubrirse por parte del Organismo a solicitud de la Compañía Contratista, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que el Organismo resuelva por escrito el aumento o reducción de costos.
- La revisión de los costos se hará según el caso, mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
 - Revisar cada uno de los precios de cada "Contrato" para obtener el ajuste.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

6

II

97

DE 17

- Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80 por ciento del importe total faltante del "Contrato"

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por el Organismo a través del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, o bien a solicitud escrita de la Compañía Contratista, la que se deberá hacer acompañar de la siguiente documentación:

- "Programa de Obra" faltante por ejecutar, debidamente avalado por el Area Responsable correspondiente;
 - "Presupuesto de Obra" faltante por ejecutar, con precios de concurso;
 - "Tabla de Insumos" que intervienen en el análisis de ajuste de costos;
 - "Costos Horarios" reanalizados con tasa de interés y los "Relativos o Indices";
 - Análisis por "Costo del Financiamiento" aplicando el "Indice de Variación", en su caso;
 - "Matrices de Precios Unitarios" de los insumos analizados con los costos ajustados;
 - "Presupuesto de Obra" faltante por ejecutar con precios unitarios ajustados del punto anterior;
 - Para respaldar la información, presentar copia fotostática de los "Relativos o Indices" y el calculo del "Indice de Variación".
- En el caso de las obras en las que se tenga establecidas la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones, oyendo a la Cámara que corresponda.

En este supuesto, el Organismo podrá optar por el procedimiento anterior cuando así convenga, para lo cual, deberá agrupar aquellas obras ó "Contratos" que por sus características contengan conceptos de trabajos similares y consecuentemente aplicables al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras ó "Contratos" y se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren determinado, y no se requerirá que la Compañía Contratista presente la documentación justificatoria.

- Los ajustes de costos se llevarán a cabo con la periodicidad y vigencia de los "Relativos o Indices" publicados por la SECODAM en el Diario Oficial de la Federación.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

6

II

97

DE 17

- En caso de modificaciones sustanciales a las condiciones contractuales que a juicio del Organismo provoquen cambios en la participación de los insumos, los nuevos valores deberán calcularse conjuntamente con la Compañía Contratista. Los cálculos para determinar dichos ajustes quedarán en poder del organismo y a disposición de la Secretaría.
- Para efectos de calculo del "Indice de Variación" en el "Costo del Financiamiento", se utilizará el promedio de los siguientes instrumentos bancarios:
 - 1).- Tasa de interés en cuenta de ahorros.
 - 2).- Tasa de interés de instrumentos de capacitación bancaria a 60 días (personas morales).
 - 3).- Tasa de interés de instrumentos de captación bancaria a 180 días (personas morales).
 - 4).- Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 días (personas morales).
 - 5).- Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento a 182 días (personas morales).

Establecido mediante oficio de la Secretaría de Obras y Servicios del Departamento del Distrito Federal que con base al decreto publicado el 29 de mayo de 1996, le corresponde primordialmente el Despacho de las materias relativas a la Normatividad de Obras Públicas y Servicios en los Proyectos y Construcción ejecutadas por el Organismo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

6

II

97

DE 17

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1.	COMPAÑÍA CONTRATISTA	(VIENE DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE OBRA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA, LICITACION PUBLICA O POR INVITACION RESTRINGIDA) Presenta solicitud de ajuste de costos, por escrito a la Residencia de Supervisión, para el Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, que analizará el estudio del ajuste de costos propuesto, anexa la documentación justificatoria en original.
2.	AREA RESPONSABLE (RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN)	(VIENE DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA). Recibe la solicitud de ajuste de costos con el estudio correspondiente en original, para el Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública. ¿Se presenta la documentación justificatoria requerida?
2.1		No, promueve con la Contratista la documentación faltante a la solicitud de ajuste de costos. (REINICIA PROCEDIMIENTO)
2.2		Si, verifica que en el Programa de Obra se encuentren definidos los conceptos, así como que las especificaciones, cantidades, importes, etc., correspondan a lo pactado en el Contrato.
3.	AREA RESPONSABLE (JEFATURA)	Avala el Programa de Obras faltantes por ejecutar y turna al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública con la solicitud y la documentación.
4.	DEPARTAMENTO DE LICITACION Y COSTOS DE OBRA PUBLICA (JEFATURA)	Recibe solicitud de ajuste de costos con la documentación comprobatoria, archiva la solicitud y turna el estudio al área de costos para su análisis.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

6

II

97

DE 17

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
5.	DEPARTAMENTO DE LICITACION y OSOTOS DE OBRA PUBLICA (AREA DE COSTOS)	Consulta el Programa de Obra y determina la obra faltante por ejecutar, determina los insumos objeto de ajuste y elabora la Tabla de Insumos.
6.		Aplica los Relativos o Indices y determina el costo ajustado de los insumos.
7.		Calcula el ajuste de los Costos Horario reanalizados aplicando los Relativos o Indices.
8		Modifica el Costo de Financiamiento en su caso, ajustando con el Indice de Variación determinado.
9.		Aplica en las Matrices de Precios Unitarios, los insumos con los costos ajustados, los Costos Horario reanalizados y en su caso, el Costo del Financiamiento ajustado.
10.		Elabora el Presupuesto de Obra faltante por ejecutar con las Matrices de Precios Unitarios ajustados.
11.		Determina el factor de ajuste de costo, archiva el estudio.
12		Elabora Reporte de Resolución a Solicitud de Ajuste de Costos en Original con dos copias, firma y turna a la Jefatura conservando una copia para su archivo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

6

II

97

DE 17

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
13	DEPARTAMENTO DE LICITACION Y COSTOS DE OBRA PUBLICA (JEFATURA)	Recibe el Reporte elabora el oficio de resolución de ajustes de costos, recaba firma del Director de Operación y envía.
14	AREA RESPONSABLE (JEFATURA)	Recibe el oficio de resolución y distribuye: Original.- Contratista. Copia 1.- Area Responsable. Copia 2.- Dirección de Operación. Copia 3.- Dpto. de Lic. y Costos de Obra Pública.
15	COMPAÑÍA CONTRATISTA	Recibe original del oficio de resolución de ajuste de costos y archiva temporalmente para presentar con Estimación correspondiente.
16	AREA RESPONSABLE (RESIDENCIA DE SUPERVISION)	Recibe copia del oficio, archiva temporalmente para aplicar en el pago de la estimación correspondiente. (CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA


PAG. 11

6

II

97

DE 17

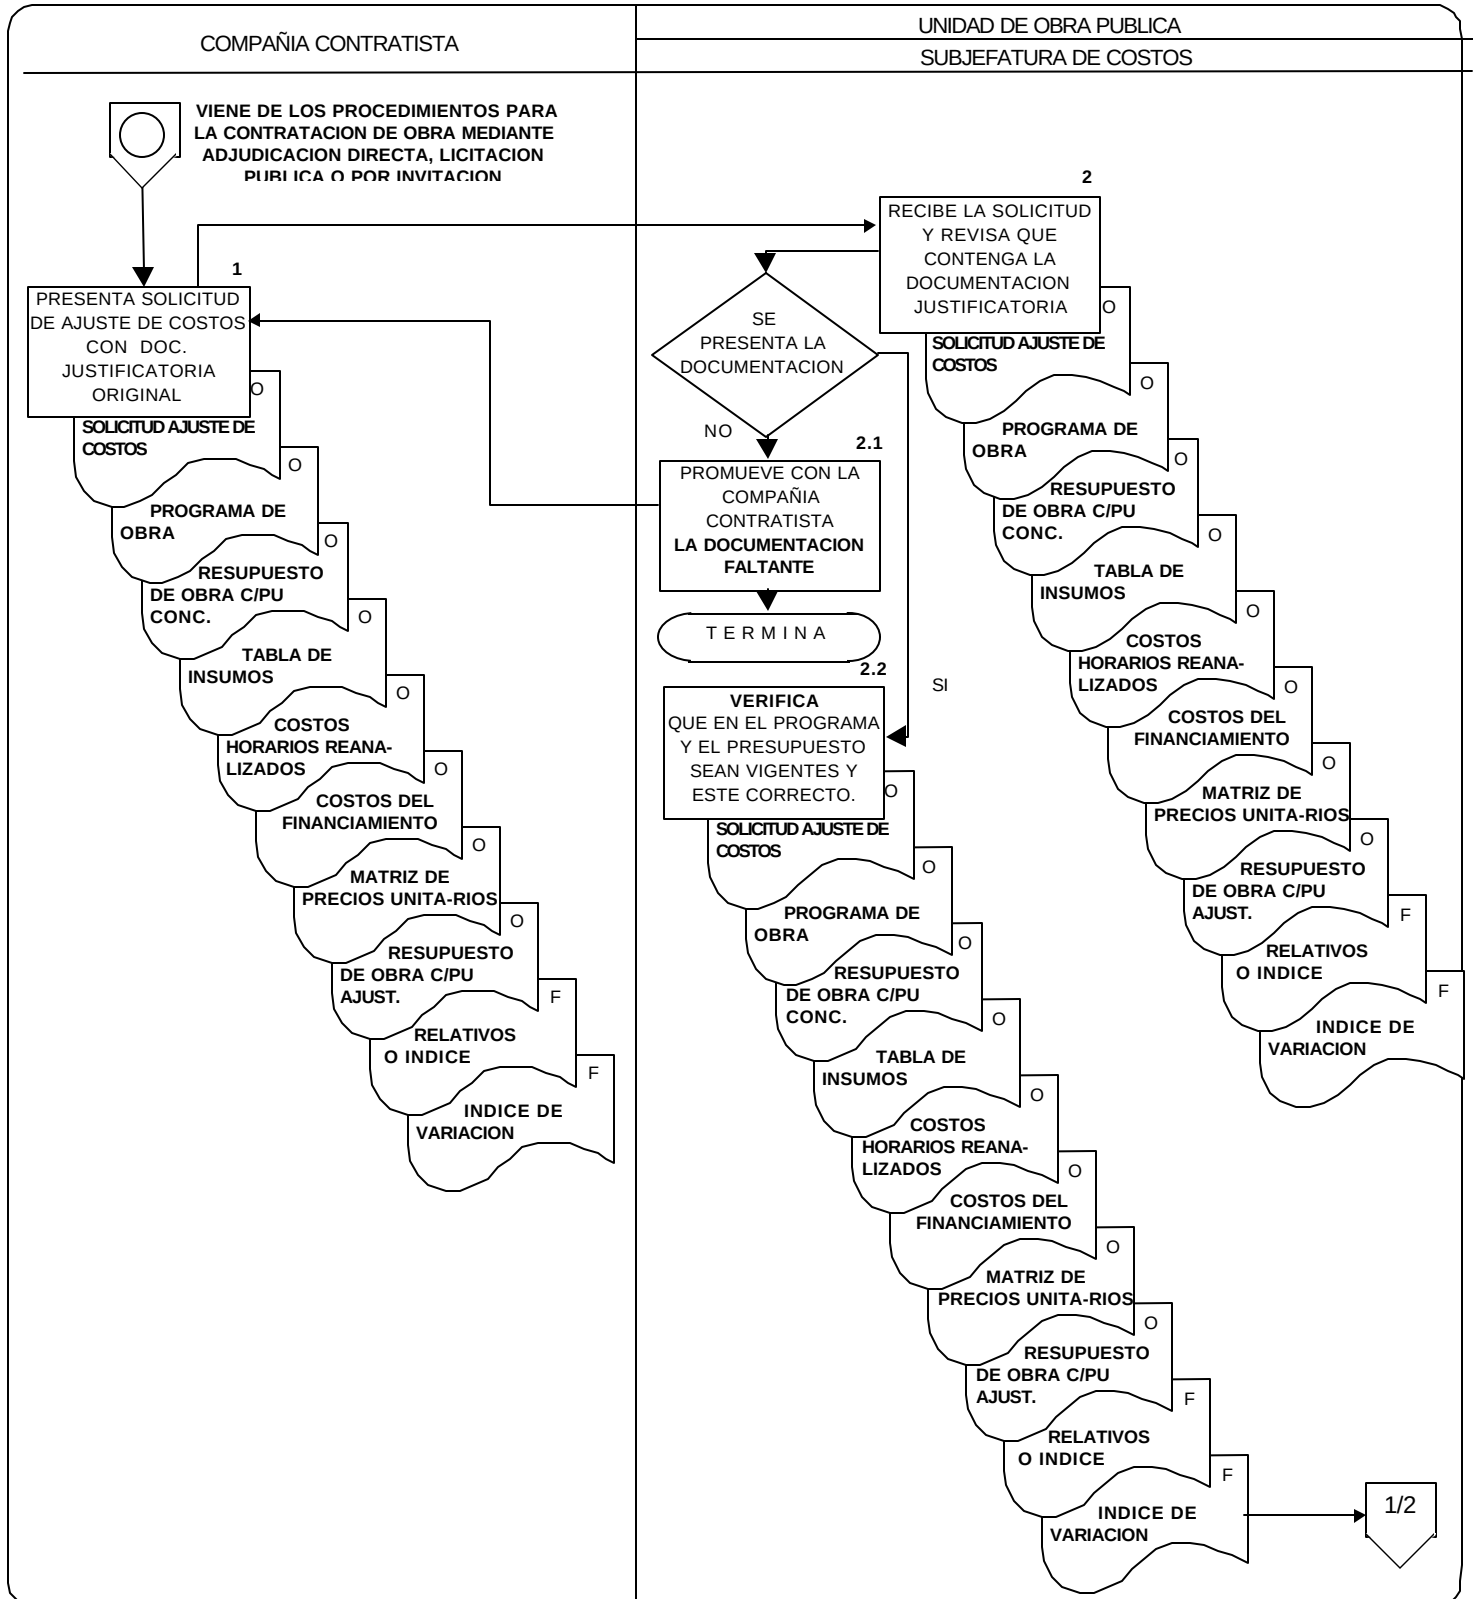



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12


6

II

97

DE 17

UNIDAD DE OBRA PUBLICA

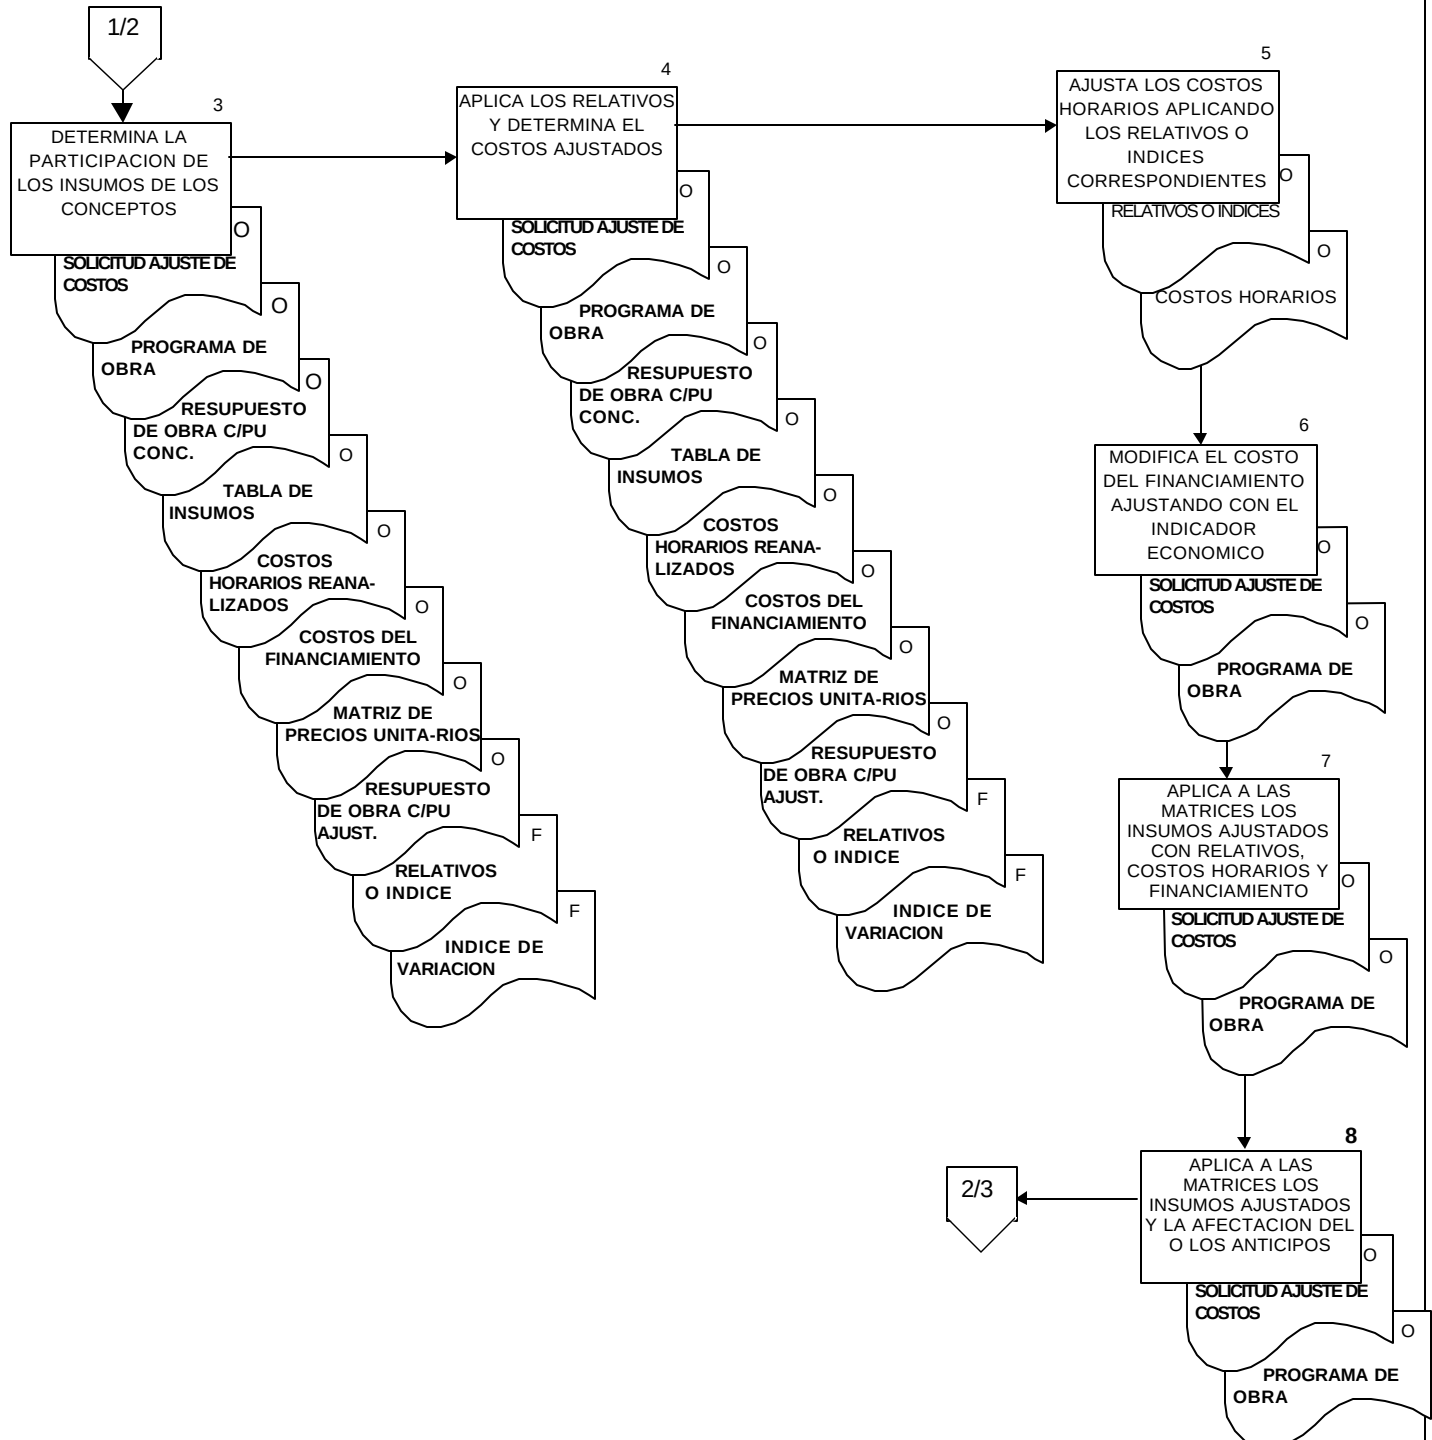



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

6

II

97

DE 17

UNIDAD DE OBRA PUBLICA

D. M. A. R.

3/2

9
ELABORA PRESUP.
VIGENTE CON CUYO
MONTO DETERMINARA
FACTO R SIN
AFECTACION DE ANT.

RELATIVOS O INDICES

COSTOS HORARIOS

10
ELABORA PRESUP.
VIGENTE CON CUYO
MONTO DETERMINARA
FACTO R CON
AFECTACION DE ANT.

RELATIVOS O INDICES

COSTOS HORARIOS

11
DETERMINA LOS
FACTORES DE AJUSTE
DE COSTOS, UNO SIN
AFECTACION Y OTRO
CON AFECTACION.

RELATIVOS O INDICES

COSTOS HORARIOS

12
ELABORA OFICIOS
INDICANDO LOS
FACTORES DE AJUSTE
AUTORIZADOS

OFICIOS SIN
AFECTACION

OFICIOS CON
AFECTACION

13
RECIBE LOS OFICIOS
DE RESOLUCION
FIRMADOS Y
DISTRIBUYE

OFICIOS
CONTRATISTA

OFICIOS
DEPYMAG

OFICIOS
SUBJEFATURA DE
LICITACION

OFICIOS
SUBJEFATURA DE
COSTOS

OFICIOS.
SUBJEF. DE SUPERV. Y
MANTEN.

OFICIOS
ACUSE

OFICIOS
ARCHIVO

3/4

14
RECIBE COPIA DEL
OFICIO Y TURNA AL
RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION PARA SU
REVISION

OFICIOS

SI

NO

12.2
EL TITULAR DEL
DEPTO. DE LICIT. Y
COSTOS DE OBRA P.
FIRMA Y DEVUELVE

OFICIOS SIN
AFECTACION

OFICIOS CON
AFECTACION

12.1
RECABA FIRMA DEL
TITULAR DE LA UNIDAD
DE OBRA PUBLICA Y
DISTRIBUYE

OFICIOS
CONTRATISTA

OFICIOS
DMAR

OFICIOS
ACUSE

OFICIOS
ARCHIVO



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

6

II

97

DE 17

FORMA QUE INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO.

- REPORTE DE RESOLUCION A SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

6

II

97

DE 17

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE DE RESOLUCION A SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Informar a la jefatura del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública la resolución a la solicitud presentada por la Contratista al estudio de la determinación del factor de ajuste de costos, así como el procedimiento seguido para el cálculo.

FORMULACION A CARGO DE: Subjefatura de Costos de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION: Mecanográfico

Nº DE EJEMPLARES: Original y dos copias.

DISTRIBUCION: Original.- Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública.
Copia No.1.- Area Responsable.
Copia No.2.- Archivo


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

6

II

97

DE 17

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE DE RESOLUCION A SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	CONTRATO No.	La clave y el número del contrato.
2	OBRA	El título o el nombre general de la obra.
3	CIA. CONTRATISTA	El nombre de la persona física o moral que se adjudico el contrato
4	FECHA DE SOLICITUD	El día, mes y año de la presentación de la solicitud de ajuste de costos de la obra pendiente por ejecutar.
5	REF.	La referencia de la solicitud presentada por la Contratista.

BASES DE LA REVISION

6	CONTRATO DE OBRA Y/O DE SERVICIOS	La cláusula octavo del contrato vigente.
7	LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS	Los artículos 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas.
8	REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS	El artículo 51 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas.
9	PROCEDIMIENTO UTILIZADO	El nombre del procedimiento utilizado para determinar el factor de ajuste de costos.
10	PROGRAMA DE OBRAS	El programa vigente avalado por el Area Responsable correspondiente.

FIRMAS

11	EL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS	Con número el factor de ajuste costos.
----	-------------------------------	--


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ANALISIS, DETERMINACION Y APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

6

II

97

DE 17

No

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

12 CON LETRAS

Con letras el factor de ajuste de costos

13 FECHA

El día, mes y año de la licitación del contrato.

14 FECHA

El día, mes y año de la variación de los costos que intervienen en la obra faltante por ejecutar.

15 FECHA

El día, mes y año en que se aplicará el factor de ajuste de costos.

FIRMAS

16 CIA. CONTRATISTA

El nombre y la firma de la persona física o moral que presenta el estudio de ajuste de costos.

17 Vo.Bo.

El nombre y la firma de la persona que analiza el estudio y aprueba el factor determinado.

18 AUTORIZA

El nombre y la firma de la persona responsable que autoriza el reporte.
